




Statens vegvesen

Status E39

Smiene-Harestad

og

Ålgård-Figgjo

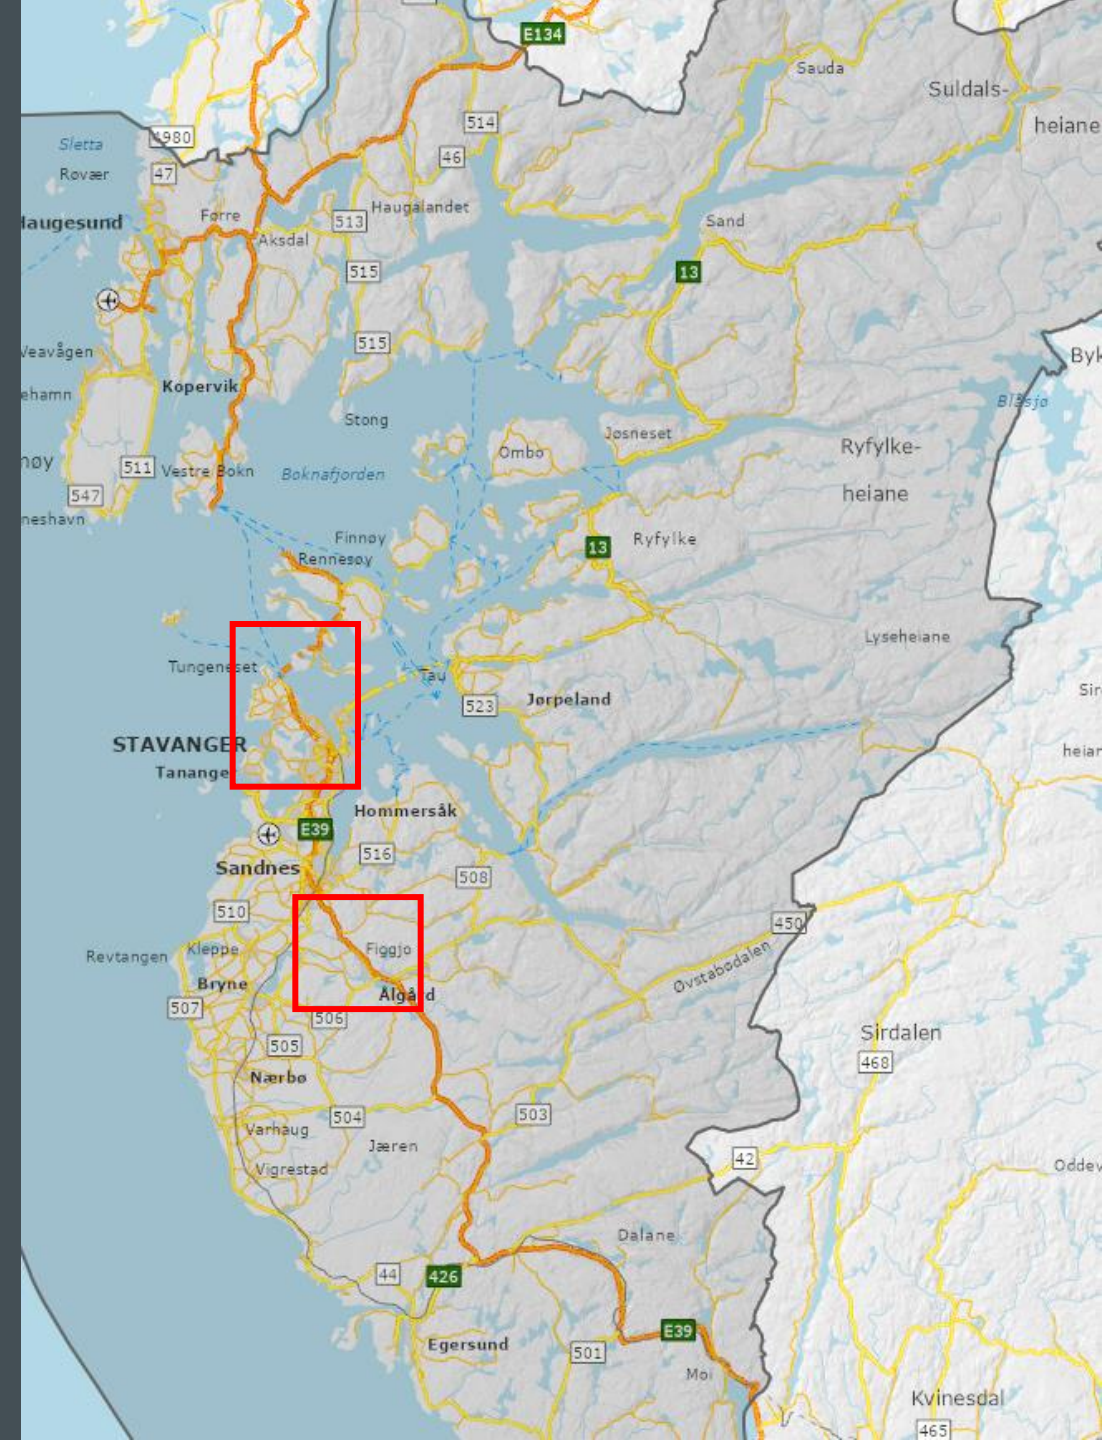


# E39 Smiene – Harestad

- I styringsgruppemøte 29. oktober orienterte Statens vegvesen om et nytt anslag for E39 Smiene-Harestad som viser en økning på 600 millioner over styringsmålet.
- Prosjektet skal nå gjennom ekstern kvalitetssikring, såkalt KS2, og Statens vegvesen kommer eventuelt tilbake til styringsgruppen med forslag til økning i styringsmål dersom KS2 og kostnadsoptimalisering bekrefter prisøkningen.



# E39 Ålgård - Figgjo

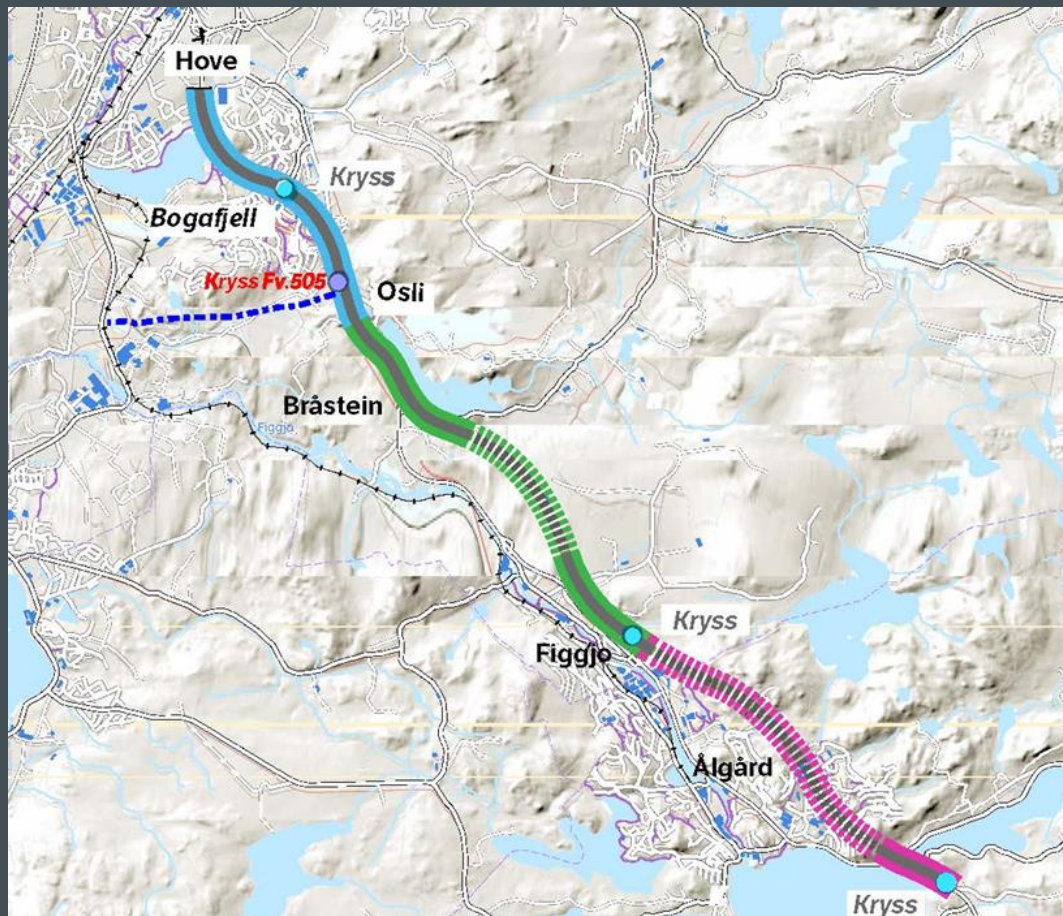

I forbindelse med forberedelse til KS2 er det gjennomført et nytt anslag for prosjektet som viser en økning på 1,1 mrd. over styringsmålet.

Årsaken til økningen er i all hovedsak nye erfaringstall for entreprisestnader.

- Prosjektet skal nå gjennom ekstern kvalitetssikring KS2, og Statens vegvesen kommer eventuelt tilbake til styringsgruppen med forslag til økning i styringsmål dersom KS2 og kostnadsoptimalisering bekrefter prisøkningen.

# Videre prosess

- ▶ KS2 gjennomføres våren 2026
- ▶ Styringsgruppen i Bymiljøpakken vedtar innspill til statsbudsjettet for E39-prosjektene i møtet 25. mars.





**Statens vegvesen**
