

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 14. mars 2016

Møtetidspunkt: 14. mars 2016, kl. 0915-1145
Møtested: Rogaland fylkeskommune
Møterom: Fylkesutvalgssalen

Deltakere		
Statens vegvesen	Terje Moe Gustavsen	Vegdirektør
Jernbaneverket	Elisabeth Enger	Jernbanedirektør
Rogaland fylkeskommune	Solveig Ege Tengesdal	Fylkesordfører
Stavanger kommune	Christine Sagen Helgø	Ordfører
Sandnes kommune	Stanley Wirak	Ordfører
Sola kommune	Ole Ueland	Ordfører
Randaberg kommune	Kristine Enger	Ordfører
Fylkesmannen i Rogaland	Magnhild Meltveit Kleppa	Fylkesmann, observatør

Agenda

Sak 8/2016 Referat fra forrige møte 29. januar 2016

Sak 9/2016 Status Bypakke Nord-Jæren – Framdrift og KS2

Sak 10/2016 NTP 2018 – 2029 – Etatenes grunnlagsdokument

Sak 11/2016 Teknologivalg Bussveien

Sak 12/2016 Rapport Bussveien rv. 509 – vurdering konsept - midtstilt, sidestilt eller parallelført bussfelt

Sak 13/2016 Gjennomføringsplan Bussveien

Sak 14/2016 Handlingsprogram 2017-2020 – førsteutkast

Sak 15/2016 Status ny nettside Bypakke Nord-Jæren

Sak 16/2016 Eventuelt

Sak 8/2016

Referat fra forrige møte 29. januar 2016

Se vedlegg 1

Sak 9/2016

Status Bypakke Nord-Jæren – Framdrift og KS2

24. februar 2016 ble det avholdt møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen knyttet til framdriften av Bypakke Nord-Jæren. Fylkesordfører, ordfører i Sandnes, samferdselssjefen, vegdirektoratet, regionvegsjef og sekretariatsleder var til stede i møtet.

Bypakke Nord-Jæren gjennomgår nå ekstern kvalitetssikring (KS2). Arbeidet skal etter planen være ferdig til sommeren 2016. Kvalitetssikringsarbeidet danner grunnlaget for en stortingsproposisjon, stortingets behandling og endelig godkjenning av Bypakke Nord-Jæren.

Regjeringen planlegger å legge fram en stortingsproposisjonen i vårsesjonen, innen september. Saken om Bypakke Nord-Jæren kan behandles av stortinget høsten 2016. Anbudet som gjelder bygging av bomstasjoner kan lyses ut når proposisjonen fremmes. Bomstasjonene kan da etter planen stå ferdige ved utgangen av 2017.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 10/2016

NTP 2018 – 2029 – Etenes grunnlagsdokument

Transportetatene la fram sitt grunnlagsdokument til Nasjonal Transportplan 29. februar 2016. Etenes har i dette dokumentet lagt fram en Klimastrategi og byområdene omtales spesielt.

Under vises korte utdrag av viktige element som er omtalt i grunnlagsdokumentet og som vil ha betydning for Bypakke Nord-Jæren:

- Fullfinansiering av Sykkelstamvegen Stavanger – Sandnes
- Statlig bidrag 50 % av Bussveien

Gitt høy ramme, og rangert etter samfunnsøkonomi, samfunnsikkerhet og sammenhengende standard/utbygging er følgende rammer foreslått:

- Bymiljømidler og belønningsmidler 66,5 mrd.kr til de ni største byområdene (49,9 mrd. bymiljømidler og 16,6 mrd belønningsmidler)
- Forutsatt inngått bymiljøavtale: 18, 5 mrd.kr til pott kollektivtiltak og gang- og sykkeltiltak. 7,8 mrd. kr til sykkelspressveger, 23,6 i statlige midler til kollektivtransportløsninger som er aktuelle for statlig delfinansiering.
- E 39 Hove- Ålgård foreslås i perioden 2024-2029 i høy ramme (1550 mill.kr statlige midler og 2000 mill.kr bompenger)

- E39 Smiene – Harestad foreslås oppstartet i perioden 2022 (300 mill.kr (2022-2023) +800 mill.kr (2024-2029) statlige midler og 1600 mill.kr bompenger)
- Rv. 509 Transportkorridor Vest foreslås i perioden 2024-2029 (700 mill. kr statlige midler og 2300 mill.kr bompenger)

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 11/2016 Teknologivalg Bussveien

Fylkestinget fattet i oktober 2015 vedtak om at trolleybuss skal brukes som teknologi for bussveien. Vedtaket er basert på, og la til grunn nasjonale føringer om nullutslipp, og at valgte bussløsninger skulle være utprøvd teknologi. Omfattende faglige vurderinger og utredninger viser at trolleybuss oppfyller vilkårene. Samferdselsdepartementet har sendt brev til Rogaland fylkeskommune, datert 19. februar (Vedlegg 2), som omhandler bymiljøavtale og statlig delfinansiering av fylkeskommunale kollektivprosjekter.

I brevet oppfordres fylkeskommunen til å åpne for ulike teknologiske løsninger for drift av Bussveien, og oppfordres samtidig til at videre arbeid med Bussveien skjer i samråd med styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren.

Fylkesordføreren har bedt om en utredning for å belyse konsekvensene av signalene som nå er gitt fra samferdselsdepartementet. **Saken er nå under utarbeidelse og vil ettersendes før møtet.**

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 12/2016 Rapport Bussveien rv. 509 – vurdering konsept – midtstilt, sidestilt eller parallelført bussfelt

Saken ble sendt ut til orientering til styringsgruppen pr.e-post 23. februar 2016. Saken er vedlagt i vedlegg 3.

Sak 13/2016 Gjennomføringsplan Bussveien

Statens vegvesen har utarbeidet en oppdatert gjennomføringsplan for Bussveien prosjektet. Se vedlegg 4.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 14/2016 Handlingsprogram 2017–2020 – førsteutkast

Sekretariatet har i tett samarbeid med alle parter utarbeidet et førsteutkast til Handlingsprogram (HP) 2017 – 2020. Se vedlegg 5.

Forslaget er basert på tidligere føringer og prioriteringer gitt av styringsgruppen. Gjennomføring av forslag til HP forutsetter bl.a. følgende:

- Storingsvedtak Bypakke Nord-Jæren høsten 2016.
- Optimal gjennomføring av prosjekt.
- Ressurstilgang og kapasitet planlegging og gjennomføring
- Finansiering (Pr i dag er det usikkerhet knyttet til statlige bidrag og behov/mulighet for låneopptak)

Førsteutkastet er utarbeidet på kort tid og ambisjonsnivået er satt deretter. Dette er et foreløpig HP og at partene har hatt svært kort tid på å arbeide med dette. Neste handlingsprogram vil kunne bli vesentlig endret i form og innhold. Vurdering av måloppnåelse og prioriteringskriterier som grunnlag for porteføljestyling må arbeides videre med i 2016.

Sammendrag, layout, bilder, tabell/figurtekster, referanser etc vil arbeides videre med fram mot endelig versjon.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber sekretariatet oppdatere handlingsprogrammet basert på innspill gitt i møtet. Handlingsprogram behandles endelig i styringsgruppen i neste møte 12. mai 2016.

Sak 15/2016 Status ny nettside Bypakke Nord-Jæren

Status ny nettside for Bypakke Nord-Jæren vil bli gitt i møtet.

Sak 16/2016 Eventuelt

Vedleggsliste

- Vedlegg 1 Referat fra møte 29. januar 2016
- Vedlegg 2 Brev fra Samferdselsdepartementet til Rogaland fylkeskommune, datert 19. februar 2016.
- Vedlegg 3 Rapport – akse øst – vest. Bussveien rv.509 – vurdering av konsept
- Vedlegg 4 Gjennomføringsplan Bussveien – notat fra Statens vegvesen
- Vedlegg 5 Førsteutkast Handlingsprogram 2017-2020

VEDLEGG 1

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren

Referat 29. januar 2016

	Fredag 29. januar 2016	09.30–11.00
Møtetidspunkt		
Møtested	Rogaland fylkeskommune	
Møterom	Fylkesutvalgssalen	

Medlemmer	Navn	Til stede	Forfall
Statens vegvesen	Terje Moe Gustavsen	X	
Jernbaneverket	Elisabeth Enger		X
Rogaland fylkeskommune	Solveig Ege Tengesdal	X	
Stavanger kommune	Christine Sagen Helgø	X	
Sandnes kommune	Stanley Wirak		X
Sola kommune	Ole Ueland	X	
Randaberg kommune	Kristine Enger	X	
Fylkesmannen i Rogaland	Magnhild Meltveit Kleppa	X	

Varamedlemmer	Navn	Møtt for
Jernbaneverket	Lars Chr. Stendal	Elisabeth Enger
Sandnes kommune	Pål Morten Borgli	Stanley Wirak

I tillegg møtte: Helge Eidsnes SVV, Gottfried Heinzerling RFK, Magne Fjell Randaberg kommune, Tonje Doolan FM, Gunn Jorunn Aasland Stavanger kommune, Kristin Barvik Sandnes kommune, Kjersti Sandvik Bernt Sekretariat Bypakke Nord-Jæren, Eilin Tvedt-Gundersen RFK, Ingeborg Dirdal RFK, Tina Jacobsen SVV, Arne Bergsvåg RFK og Stine Haave Åsland, sekretariatsleder

Sak 1/2016 Referat fra forrige møte 30. november 2015

Referat godkjent.

Sak 2/2016 Status Bypakke Nord – Jæren – Framdrift og KS2

KS2 –konsulentene kvalitetssikrer nå Bypakke Nord–Jæren og Sykkeltamvegprosjektet som det første prosjektet i bypakken. Målet er fortsatt at kvalitetssikringsprosessen gjennomføres slik at Bypakke Nord–Jæren kan behandles i Stortinget våren 2016.

Reguleringsplan for bomstasjon på Randabergveien i Stavanger er vedtatt i kommunalstyret for byutvikling (KBU), men vedtaket er anket til formannskapet. Anken behandles neste torsdag.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 3/2016 Kommunikasjon i Bypakke Nord–Jæren

Sekretariatet orienterte om arbeidet med nettside for bypakken.

Følgende innspill til innhold på nettsiden ble gitt av styringsgruppen:

- Viktig å få fram at bypakken skal gjøre det bedre for folk å foreta sine reiser i byområdet.
- Viktig at folk kan finne det de er opptatt av. Hvordan vil det bli der jeg bor? Hvor kommer bomstasjonene?
- Budskapene på siden må være enkle og kommunikative.
- Sette bypakken inn i et større perspektiv. Dette er det lokale klimaforliket.
- Få fram at 70 % av bompengene går til kollektiv, sykkel og gange og 30 % til veg.
- Nullvekstmålet må omtales.
- Se til Miljøpakken i Trondheim – de har jobbet godt med sitt nettsted.
- Viktig å huske at alle er gode ambassadører for Bypakke Nord–Jæren

Styringsgruppen ønsker status på kommunikasjonsarbeidet i hvert møte.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 4/2016 Handlingsprogram 2017–2020

Det er viktig å få fram et handlingsprogram (HP) for bypakken. Første prioritet er å holde framdriftsplan med de frister som er satt. Ambisjonsnivået for HP må settes utfra tiden som er til disposisjon.

Styringsgruppen legger forslag til Bypakke Nord-Jæren vedtatt i fylkestinget 9. desember 2014 til grunn for HP. Viktig forholde seg til de mål som er satt – 0-vekst og økt framkommelighet. Fordelingsprofil for bompengene med 70 % til kollektiv/sykkel/gange og 30 % til vegtiltak legges til grunn.

Styringsgruppen ga følgende innspill til arbeidet videre med HP:

- Klimautfordringene, klimaforliket og det at vi skal nå klimamål som er satt, må komme tydeligere fram i HP.
- Bypakke Nord-Jæren er det lokale klimaforliket.
- Byutvikling må løftes fram – få fram mulighetene for byområdet.
- Det må vurderes om det er konkrete mål i de enkelte kommunene som bør løftes fram.
- Viktig å få fram reguleringsplanene. Her må vi være proaktive for å unngå forsinkelser.

Styringsgruppen ber om en oversikt over kritiske punkt i de ulike planprosessene som pågår. Hva kan skape forsinkelser og er dette noe som kan løses på et tidligere tidspunkt for å unngå forsinkelser.

Vedtak:

Styringsgruppen ber sekretariatet fortsette arbeidet med handlingsprogram for 2017–2020, basert på innspill gitt i møtet. Et første utkast til handlingsprogram legges fram for styringsgruppen i neste møte 14 mars 2016. En oversikt over kritiske punkt i de ulike planprosessene som pågår presenteres i neste møte.

Sak 5/2016 Nytt sykehus SUS på Ullandhaug

Stavanger kommune har allerede gjennomført et faglig drøftingsmøte med representanter fra Stavanger, Sandnes og Sola kommuner, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen som skal se nærmere på konsekvensene av ny lokalisering. Det ble gitt en orientering fra møtet.

Problemstillinger som ble drøftet i møtet var knyttet til trafikale løsninger for å betjene nytt sykehus på Ullandhaug. Kollektiv, sykkel og parkeringsdekning ble drøftet spesielt.

Stavanger kommune blir som planmyndighet ansvarlig for arbeidet videre. Viktig å få fram eventuelle konsekvenser for prioriteringene i bypakken.

RFK blir ansvarlig for trafikale løsninger og vil samarbeide tett med Statens vegvesen.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 6/2016 Status Bussveien

Orientering om status ble gitt i møtet. En mer detaljert gjennomføringsplan for Bussveien vil presenteres i neste møte.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 7/2016 Eventuelt

Vegdirektøren orienterte om status i NTP arbeidet. Etatenes forslag til NTP 2018–2029 legges fram 29. februar 2016.



DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref

15/325-

Dato

19.02.2016

Bymiljøavtale og statlig delfinansiering av fylkeskommunale kollektivprosjekter

Vi viser til omtale av helhetlige bymiljøavtaler og statlig delfinansiering av fylkeskommunale kollektivprosjekter i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.

Rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler og statlig delfinansiering framgår av Samferdselsdepartementets brev av 2. juni og 4. juli 2014 til Vegdirektoratet.

Nord-Jæren er omfattet av ordningen med bymiljøavtaler. Det er videre slått fast i ovennevnte brev av 4. juli 2014 at Bussveien er aktuell for statlig delfinansiering gjennom en bymiljøavtale. Tilskuddet er avgrenset til infrastrukturtiltak.

Samferdselsdepartementet er kjent med at fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2015 vedtok at Bussveien skal bygges ut for trolleybussdrift fra 2021. En slik løsning vil bl.a. kreve investeringer i elektroinfrastruktur langs traseen.

I retningslinjene for statlig delfinansiering av fylkeskommunale kollektivprosjekter er det slått fast at statens andel skal være 50 pst. av prosjektkostnadene uavhengig av hvilken transportform som velges lokalt. Samtidig er det et sentralt poeng at det statlige tilskuddet ikke skal gå til fordyrende løsninger.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at et statlig tilskudd til Bussveien gjennom bymiljøavtalene skal bidra til å få på plass et fleksibelt, miljøvennlig og kostnadseffektivt kollektivtilbud på Nord-Jæren. Det skjer nå en rask utvikling av så vel dieselmotorer og biodrivstoff som batteridrift og hybriddrift for buss. Etter departementets vurdering kan det derfor framstå som uheldig å vedta en bestemt teknologisk løsning for drift av Bussveien. I planlegging og anbudsprosess bør det tas høyde for ulike teknologiske løsninger for lav- eller nullutslipp og klimanøytralt drivstoff, samtidig som det stilles tydelige krav til vektlegging av

VEDLEGG 2

miljø- og klimagassutslipp i anbudet.

For å sikre gode helhetlige løsninger for transportsystemet i byområdet oppfordrer departementet til at fylkeskommunens videre arbeid med Bussveien skjer i samråd med styringsgruppa for Bypakke Nord-Jæren.

Samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for oppstart av forhandlinger om en bymiljøavtale for Nord-Jæren så snart nødvendige avklaringer knyttet til Bypakke Nord-Jæren er på plass. Bypakke Nord-Jæren vil være en del av bymiljøavtalen. Vi vil i den forbindelse fastsette et mandat som Vegdirektoratet, som statens representant, skal legge til grunn i forhandlingene.

Med hilsen

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Braaten Larssen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Vegdirektoratet

Saksframstilling til SG Bypakken

Bakgrunn

I møtet den 30. november ble styringsgruppen orientert om et pågående arbeid for å se på alternativt konseptvalg for Bussveien på øst–vest akse (rv. 509). Arbeidet har foregått på administrativt nivå, i et tett samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Bussvei-teamet i Statens vegvesen.

Arbeidet startet opp da en rekke momenter gjorde at det ble stilt legitime spørsmål om hvorvidt et sidestilt konsept var i tråd med de overordnede målsettingene for Bussveien.

Momentene som ble reist var:

- Mål om nullvekst i personbiltransporten og Bypakke Nord-Jæren
- Forsinkelsesfri bussvei og BRT-standard (bus rapid transit-standard)
- Nye trafikale vurderinger og analyser
- Nedklassifisering fra riksveg til fylkesveg
- Trolleybuss som teknologivalg

Av de punktene over var det i særlig grad foreløpige trafikkanalyser for Bussveien gjennom Kannik, gjort i samband med KDP Sentrum, som viste at et sidestilt konsept ikke ville sikre forsinkelsesfri fremkommelighet, og i tillegg ville det gi tilnærmet uakseptable konsekvenser for gjennomgangstrafikken. Utover dette viste trafikkanalysen fra fv. 409 at det var nødvendig med midtstilt bussvei på fylkesveidelen av TKV.

Bussveien har lagt til grunn en prioritering av trafikantergruppene i tråd med nasjonale målsettinger og målene for Bypakken. De ulike trafikantergruppene er gitt følgende prioritering:

1. Kollektivtrafikk
2. Gående og syklende
3. Næringstransport
4. Personbiltransport

Oppdraget som ble gitt til arbeidsgruppen var å vurdere tre ulike konsept for bussvei fra Kannik (ved Olav Vs gate) til Sundekrossen (ikke inkludert krysset i Sundekrossen). Gruppen ble også bedt om å definere konfliktområder mht. de tre ulike løsningene og drøfte det som er beslutningsrelevant mht. å gi en anbefaling for et helhetlig system for Bussveien i øst–vest–aksen. De tre konseptene som har blitt vurdert er:

1. Midtstilt bussvei
2. Sidestilt bussvei

3. Parallelført bussvei

Arbeidet er gjennomført under omfattende tidspress, og har vurdert trafikale virkninger, anleggsgjennomføring og kostnader, areal og tverrsnitt, kryss, holdeplasser, sykkel, målpunkt, tilgjengelighet for gående, konsekvenser for side-veinettet og sideareal og grønt (eks. trær, sammenhengende grønnstruktur). Arbeidet har munnet ut i en rapport som er vedlagt.

Rapporten skal til politisk behandling i Stavanger kommune den 3. mars (KBU) og påfølgende behandling den 10. mars (FSK).

Vurdering

Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen har lagt ned et omfattende arbeid for å belyse problemstillingene i akse øst-vest. Noe av tidspresset har vært for å sikre at styringsgruppen får oppdatert beslutningsrelevant informasjon til behandling av handlingsprogram for Bypakken, og til behandling av framdriftsplanen for Bussveien.

Akse øst-vest består av områder med svært ulike utfordringer, fra transformasjonsområder på Sunde/Revheim, til utfordringer for Stavanger sentrum i Kannik. Det har derfor vært naturlig å dele strekningen i ulike delstrekninger. Delstrekningene er:

- Delstrekning 1 fra Stavanger sentrum til Mosvannet
- Delstrekning 2 fra Mosvannet til Madlaforen
- Delstrekning 3 fra Madlaforen til Sundekrossen

Styringsgruppen for Bypakken må i hovedsak ta stilling til konsekvenser for anleggsgjennomføring og kostnader. Rapporten belyser anleggsgjennomføring og kostnader for de ulike konseptene, men i hovedsak sett opp mot de andre konseptene. I rapporten er det ikke gjort rede for konkrete detaljer i form av tidshorisont på forsinkelsen, og hvor mye ekstra kostnader som vil tilløpe på de ulike alternativene.

Forsinkelsen ved et eventuelt konseptskifte på akse øst-vest er minimum 2 år. Videre er det fra Statens vegvesen lagt til grunn en ekstra kostnad på ca. 500 millioner kroner. Dette beløpet fremkommer ved å bruke de samme sjablongverdier som er lagt til grunn for Bussveien for øvrig, sjablonger har fram til nå vist seg å være relativt presise (+/- 15%).

Det vises for øvrig til egen sak om fremdriftsplan for Bussveien.

Konklusjon

Arbeidsgruppen har ikke funnet rom for å anbefale et helhetlig konsept for hele traseen. Representantene fra de tre organisasjonene er alle enige om at et sidestilt konsept ikke har de kvaliteter som er nødvendige for Bussveien, og anbefaler at dette utgår.

VEDLEGG 3

Videre har arbeidsgruppen anbefalt parallelført bussvei gjennom Kannik (delstrekning 1). Dette gjøres da en da unngår ombygging av det nye krysset ved E39/rv. 509 (motorveikrysset), samt at det gir tilfredsstillende trafikkavvikling i Kannik.

For delstrekning 2 og 3 mener arbeidsgruppen at valg av konsept først kan tas etter mer inngående vurderinger i et forprosjekt/videre arbeid med reguleringsplan.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak – framdriftsplan Bussveien

Generelt

Bussveien på Nord-Jæren er per dags dato Europas lengste bussvei, og er et prosjekt med en anslått kostnad på ca. 9 000 millioner kroner fordelt på 22 delstrekninger/reguleringsplaner (tidligere 26). Bussveien utgjør således 1/3 av den samlede porteføljen til Bypakken.

Som system er Bussveien Norges første kollektivsystem basert på «tenk bane, kjør buss». Når Bussveien er ferdig vil den inneha over 50 kilometer med sammenhengende kollektivtrase, hvor ca. 90% av trassen går atskilt fra annen trafikk. Dette sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene.

Framdriftsplan

I sist orientering om framdrift/gjennomføring av Bussveien ble det i saksframlegget lagt til grunn den overordnende bestilling om ferdigstilling til sommeren 2021. I løpet av høsten har Statens vegvesen jobbet med revidert framdriftsplan, og arbeidet viser at det ikke er mulig å ferdigstille Bussveien i tråd med bestilling. Dette selv om det i planen er lagt til grunn både «best case» på en rekke momenter, og det er foretatt strategiske grep for å sikre framdriften. Denne framdriftsplanen som leveres nå er basert på fylkestingets vedtak om teknologivalg, og det tas forbehold om at nye momenter vil kunne gi behov for å revidere planen.

Framdriftsplanen er utarbeidet for de delprosjekt som er under planlegging av teamet på Bussveien i Statens vegvesen (prioritert 1 – 3). Gantt-diagram over prosjektene følger som vedlegg 1. Byggestart er i hovedsak satt til to år før åpning.

Prosjekt	Prioritet	Oppstart plan	Ferdig plan	Åpning
Delprosjekt 26 – Risavika havn – Tankveien	2	jan.17	jan.20	jan.22
Delprosjekt 1 – Tankveien – Sundekrossen	2		jun.16	des.20
Delprosjekt 2 – Tananger ring	2	aug.16	feb.20	jun.23
Delprosjekt 4 – Sundekrossen – Kvernevik ring	2		jun.17	jun.20
Delprosjekt 5 – Kvernevik ring	2	sep.16	nov.19	mar.23
Delprosjekt 8 – Sundekrossen – Mosvannet	2	jun.16	okt.19	aug.23
Delprosjekt 9 – Mosvannet – Hillevåg	1	apr.16	aug.18	des.21
Delprosjekt 14 – Stasjonsveien – Diagonalen	1		aug.17	des.20
Delprosjekt 15 – Diagonalen – Gausel st	1		aug.16	nov.19
Delprosjekt 16 – Gausel st – Hans og Grete	1		jan.17	mai.20
Delprosjekt 18 – Stokkaveien – Ruten	1		sep.18	des.21
Delprosjekt 20 – Ruten – Vatnekrossen	3	apr.16	jan.20	apr.23
Delprosjekt 22 – Kollektivbroen – Åsenveien	1		jan.17	mai.20
Delprosjekt 23 – Lagerveien	1	sep.16	jun.19	jun.21

Prosjekt hvor det ikke står dato for oppstart er allerede igangsatt.

Som en vil se av tabellen er det endringer i antall planer. Prosjektene på Rv. 509 fra Sundekrossen til Mosvannet er slått sammen til et prosjekt på i overkant av 7 km. Dette var

VEDLEGG 4

tidligere delt inn i tre ulike prosjekt. Videre er de to prosjektene i Stavanger sentrum slått sammen til et prosjekt på 3,2 km. Det er planlagt at de to prosjektene på strekningen Sundekrossen – Hillevåg skal ha felles planprogram. Korridor 3 er videre tenkt planlagt som et prosjekt.

Av utfordringer som er like for alle aksene må en i særlig grad trekke frem utfordringene rundt kryssløsninger, da i særlig grad for syklistene. Videre kommer en ikke bort ifra at de arealmessige inngrep som er nødvendige for fremføring av Bussveien er krevende.

Korridor 1

Prosjekt	Prioritet	Oppstart plan	Ferdig plan	Åpning
Delprosjekt 9 – Mosvannet – Hillevåg	1	apr.16	aug.18	des.21
Delprosjekt 14 – Stasjonsveien – Diagonalen	1		aug.17	des.20
Delprosjekt 15 – Diagonalen – Gausel st	1		aug.16	nov.19
Delprosjekt 16 – Gausel st – Hans og Grete	1		jan.17	mai.20
Delprosjekt 18 – Stokkaveien – Ruten	1		sep.18	des.21
Delprosjekt 22 – Kollektivbroen – Åsenveien	1		jan.17	mai.20
Delprosjekt 23 – Lagerveien	1	sep.16	jun.19	jun.21

Prosjekt hvor det ikke står dato for oppstart er allerede igangsatt.

Denne korridoren er gitt høyeste prioritert av Styringsgruppen for Bypakken, og det er i framdriftsplanen forsinkelse i forhold til den ønskede åpning sommeren 2021. Planlagt åpning av aksene vil være til julen 2021.

Det er to prosjekt som er svært tidskriske på aksene, og dette er prosjektet i Stavanger sentrum (Mosvannet – Hillevåg) og prosjektet fra Kvadrat til Sandnes sentrum (Stokkaveien – Ruten). Ved forsinkelser på disse vil dette gi forsinket åpning av korridoren. I tillegg er prosjektet Stasjonsveien – Diagonalen (Jåttåvågen) svært komplisert, da prosjektet både skal gå i tunnel/bru fra Hinna. En slik løsning krever stenging av Jærbanen, og i tillegg skal Bussveien gjennom krysset ovenfor Jåttåvågen (karusellen). Med slike utfordringer kan det oppstå forsinkelser i plan-, prosjekterings- og byggefasen.

Statens vegvesen søker å løse noen av de utfordringer som de nevnte prosjekt gir ved å sikre at noen av våre mest erfarne medarbeidere blir satt på prosjektene. I tillegg legger vi opp til at de i tidskriske prosjekt får god faglig støtte gjennom egne assistenter. Dette gjøres av to grunner. For det første sikrer det tilleggs kapasitet i prosjektene dersom det skulle oppstå situasjoner/problemstillinger vi ikke har tatt høyde for. For det andre vil det gjøre prosjektene langt mer robuste, da avbrudd og forsinkelser i prosjektene på grunn av uforutsette hendelser ikke blir like utslagsgivende.

VEDLEGG 4

Korridor 2

Prosjekt	Prioritet	Oppstart plan	Ferdig plan	Åpning
Delprosjekt 26 – Risavika havn – Tankveien	2	jan.17	jan.20	jan.22
Delprosjekt 1 – Tankveien – Sundekrossen	2		jun.16	des.20
Delprosjekt 2 – Tananger ring	2	aug.16	feb.20	jun.23
Delprosjekt 4 – Sundekrossen – Kvernevik ring	2		jun.17	jun.20
Delprosjekt 5 – Kvernevik ring	2	sep.16	nov.19	mar.23
Delprosjekt 8 – Sundekrossen – Mosvannet	2	jun.16	okt.19	aug.23

Prosjekt hvor det ikke står dato for oppstart er allerede igangsatt.

Korridoren vil være klar til åpning i august 2023. I særlig grad er det nye sammenslåtte prosjektet fra Sundekrossen til Mosvannet og Tananger ring tidskritiske prosjekt. Sundekrossen – Mosvannet er et prosjekt på 7 km, omtrent dobbelt så langt som det nest lengste prosjektet i Bussveien. Prosjektet har flere utfordringer, som det er gjort nærmere rede for i prosjektrapporten for strekningen Stavanger sentrum – Sundekrossen (egen sak).

Hva angår Tananger ring har dette prosjektet utfordringer i grenselandet mellom full fremkommelighet for Bussveien og det å ivareta stedets egenart. Det er blitt enighet vedrørende innsigelsen til sentrumsplanen som det ble gjort rede for høsten 2015, og innsigelsen blir trukket så fort de nødvendige oppdatering av plankart og bestemmelser er utført.

Også på denne aksen er det valgt en løsning med egne assistenter for å sikre robusthet i de mest tidskritiske prosjektene.

Korridor 3

Prosjekt	Prioritet	Oppstart plan	Ferdig plan	Åpning
Delprosjekt 20 – Ruten – Vatnekrossen	3	apr.16	jan.20	apr.23

Korridor 3 går fra to enkeltstående prosjekt av normal størrelse, til ett lengre prosjekt. Dette gjøres da det arbeidet med forprosjektrapport for det prosjekt som er under regulering på strekningen Ruten – Skippergata, viser at det er vanskelig å foreta detaljregulering på deler av strekningen, uten å se de ulike problemer og løsninger på hele korridorene samlet.

Det er lagt til grunn at forprosjektet på pågående prosjekt skal klare å gi de nødvendige avklaringer i forhold til hvilke områder som kan frigis for båndlegging før prosjektene blir slått sammen.

Strategiske grep

Som styringsgruppen er orientert om valgte Statens vegvesen å omorganisere arbeidet med Bussveien gjennom etablering av et felles team for planlegging. Teamet fikk sin oppstart i september 2015, og i tillegg til intensiv planlegging, har en brukt høsten på å bedre samhandling og samarbeid i teamet. Ved etableringen av teamet gikk Bussveien fra å være 26 delprosjekt som skulle bli en bussvei, til en prosjektorganisasjon med et overordnet perspektiv, helhetlig tankegang og formål om å realisere Bussveien så raskt som mulig.

VEDLEGG 4

Allerede tidlig høsten 2015 ble det klart at det var nødvendig med et svært tett samarbeid mellom prosjekteier (Rogaland fylkeskommune) og teamet. Det er derfor etablert en praksis hvor prosjekteier deltar direkte i teamet sine samlinger. Erfaringen fra høsten viser at dette gir tilnærmet sømløst samarbeid, og har i vesentlig grad kuttet kommunikasjonsutfordringene mellom organisasjonene.

Å planlegge Bussveien er i hovedsak planlegging av et konsept som ikke finnes i håndbøkene til Statens vegvesen, og krever således at en har kjennskap til de fravik som teamet ser på som en forutsetning dersom enn skal oppnå de overordnede målsettingene til Bussveien. Det er derfor etablert en felles intern prosjektgruppe/fagpool intern i Statens vegvesen hvor de samme ressursene blir brukt på tvers av prosjekter. Dette sikrer kjennskap til Bussveien som konsept, og enn sparer tid på at en må «lære opp» nye personer i de fravik og løsninger som benyttes. Totalt sett utgjør denne ressurspoolen per dags dato ca. 12 årsverk, som Bussveien kan disponere inntil 100% når dette er nødvendig. Ressurspoolen blir ventelig oppgradert med ytterligere 1–2 årsverk før sommeren 2016.

Det er etablert en samarbeidsgruppe på administrativ nivå mellom Rogaland fylkeskommune, kommunene, fylkesmannen og Statens vegvesen hvor formålet er å ha nødvendig oversikt og se Bussveien som helhet. Samarbeidsgruppen blir et organ hvor partene blant annet kan drøfte aktuelle problemstillinger, og bidra til å holde en god framdrift. Samarbeidsgruppen startet opp med sitt første møte primo mars 2016.


Gjennom høsten 2015 og vinteren 2016 har en sett på ressurssituasjonen til teamet som jobber med Bussveien, opp imot ulike scenarioer for ferdigstillelse av Bussveien. I den framdriftsplan som blir presentert øker Statens vegvesen tilgjengelige stillingsressurser for teamet på Bussveien betraktelig. Opptrappingen er påbegynt og blir ferdigstilt 2. kvartal 2016.

Kommunene prioriterer Bussveien svært høyt med kapasitet og kompetanse. Det er likevel knapt med ressurser til både bypakke-prosjektene og andre planoppgaver i kommunene. Samarbeidspartene har derfor startet, og jobber videre med, å finne en effektiv arbeidsform som kan sikre både kvalitet og framdrift.

Det er, som det er redegjort for ovenfor, foretatt en gjennomgang av de prosjekter som gjenstår, for å se på hvilke av disse som kan slås sammen med tanke på mer effektive planprosesser. I tillegg blir de tilgjengelige ressurser benyttet slik at det er stor grad av overføringsverdi mellom prosjektene.

VEDLEGG 4

Vedlegg 1 – Gantt-diagram over delprosjektene i Bussveien

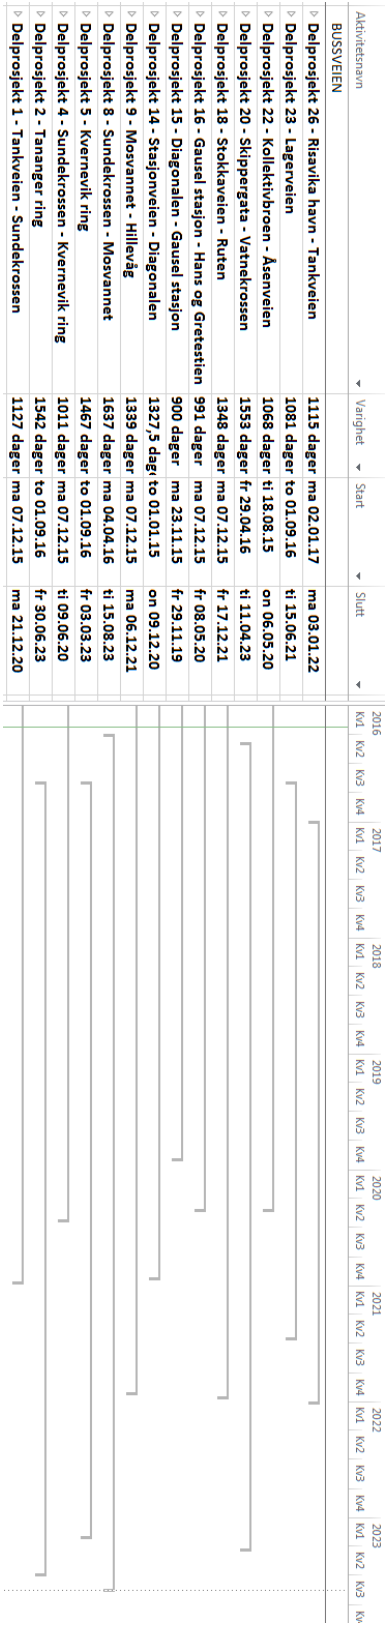

Handlingsprogram

Bypakke Nord-Jæren 2017 – 2020



Statens vegvesen



Jernbaneverket



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE



STAVANGER KOMMUNE



SANDNES KOMMUNE

Sola
kommune



Randaberg
kommune



Forord

Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren legger med dette fram sitt første handlingsprogram, med forslag til prioriteringer for årene 2017 – 2020.

I arbeidet med handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i forslag til Bypakke Nord-Jæren behandlet i fylkestinget 9. desember 2014, gjennomføringsplan behandlet i styringsgruppen 30 november 2015, Nasjonal transportplan 2014–2023 og handlingsprogrammet til Statens vegvesen.

Gjennomføring av handlingsprogrammet krever at Stortinget vedtar Bypakke Nord-Jæren. Det er lagt opp til at stortingsbehandlingen kan starte opp høsten 2016, etter at ekstern kvalitetssikring KS2 er gjennomført.

Det legges opp til årlig revisjon av handlingsprogrammet. Dette er en del av porteføljestyringssystemet for bypakken.

Arbeidet med handlingsprogrammet har pågått siden desember 2015, gjennom et godt samspill mellom statsetatene, fylkeskommunen og de fire kommunene på Nord-Jæren. Styringsgruppen består av deltakere fra syv parter og ledes av Vegdirektøren.

Styringsgruppen ber om at de fire involverte kommunene (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) og Rogaland fylkeskommune gjennomfører politisk behandling av forslag til handlingsprogram innen 1 juli 2016.

Kristine Enger

Ordfører i Randaberg

Ole Ueland

Ordfører i Sola

Stanley Wirak

Ordfører i Sandnes

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører i Rogaland

Elisabeth Enger

Jernbanedirektør

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør

Innhold

Forord.....	2
Sammendrag	6
1. Innledning.....	7
2. Bakgrunn.....	8
2.1 Brev fra Samferdselsdepartementet 2 juni 2014	8
2.2 Dagens bompengoordning Nord-Jærenpakken.....	8
2.3 Forslag til Bypakke Nord-Jæren	9
3. Mål og styring av Bypakke Nord-Jæren.....	10
3.1 Mål for Bypakke Nord-Jæren.....	10
3.2 Beslutningsprosesser.....	10
3.3 Porteføljestyling av Bypakke Nord-Jæren	12
4. Status – byområdet Nord-Jæren	12
4.1 Befolkningsutvikling	12
4.2 Trafikkutvikling	15
4.2.1 Personbil	15
4.2.2 Kollektivtransport	16
4.2.3 Sykkel	17
4.3 Reisevaner	18
4.4 Miljø – støy og luft.....	19
4.4.1 Støy.....	19
4.4.2 Lokal luftkvalitet	19
4.5 Framkommelighet	20
4.5.1 Sykkel	20
4.5.2 Gange	21
4.5.3 Kollektivtrafikk.....	22
4.5.4 Næringslivets transporter.....	22
4.5.5 Personbiltrafikk.....	23
4.6 Nullvekst i persontransporten	24
4.7 Arealbruk og parkering.....	24
4.7.1 Arealbruk	24

VEDLEGG 5

4.7.2	Parkering	25
5.	Status for tiltak Bypakke Nord-Jæren	26
6.	Forutsetninger for handlingsprogram 2017–2020	29
6.1	Nasjonale føringer	29
6.2	Bompengeselskap	30
6.3	Finansiering	30
6.3.1	Nasjonal transportplan 2014–2023	30
6.3.2	Forutsetninger i fylkestingets vedtak desember 2014	30
6.4	Kapasitet planlegging, kompetanse og samhandling	31
7.	Forslag til prioriteringer – Utbyggingsprosjekt 2017–2020	32
7.1	Bussveien	32
7.1.1	Korridor 1	33
7.1.2	Korridor 2	34
7.1.3	Korridor 3	34
7.1.4	Korridor 4	34
7.2	Sykkelstamvegen	35
7.3	Transportkorridor Vest	35
7.4	E39 Hove – Ålgård	36
7.5	Bomstasjoner Bypakke Nord-Jæren	36
8.	Forslag til prioriteringer – planleggingsprosjekt 2017–2020	37
8.1	E39 Smiene – Harestad	37
8.2	Fv. 330 Hoveveien: Kollektivfelt	38
8.3	Fv. 505 Foss–Eikeland – E39 Bråstein	38
8.4	Kollektivtiltak Hillevåg– SUS – Tjensvoll – UiS–Diagonalen – Gauselvågen	38
8.5	E39 Schancheholen – Solasplitten: kollektivfelt	39
8.6	Rv. 509 Solasplitten: Kollektiv-/tungbilfelt	39
9.	Forslag til prioriteringer – programområder	40
9.1	Sykkeltiltak	40
9.2	Tiltak for gående	42
9.3	Kollektivtransport	43
9.4	Trafikksikkerhet	44
9.4.1	Ulykkessituasjon	44
9.4.2	Prioriteringer	44

VEDLEGG 5

9.4.3 Tilfartskontroll og variable fartsgrenser E39	44
9.5 Miljø – støy og luftforurensing	45
10. Øvrige innsatsområder	45
10.1 Kommunikasjon.....	45
10.2 Mobilitetsarbeid.....	45
10.3 Drift sekretariat Bypakke Nord-Jæren	46
11. Forventet måloppnåelse av handlingsprogram 2017–2020	47
11.1 Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren	47
11.2 God framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport	48

Sammendrag

UTKAST

1. Innledning

Med rundt 240.000 innbyggere i 2015 utgjør kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kjernen i Stavangerregionen. Regionen er Norges tredje største byregion preget av sterk vekst nærings- og befolkningsmessig de siste tiårene. I regionen og landet for øvrig, er vi for tiden inne i en periode med lavkonjunktur. Aktiviteten innen oljebransjen er lavere enn den har vært de siste årene og dette har også fått innvirkninger på andre bransjer. Arbeidsledigheten har økt og trafikken har blitt redusert. Det er ikke i dag mulig å vurdere om disse svingningene er midlertidige eller av varig karakter. Oljeprisutvikling, tildeling av offshore-kontrakter og næringslivets omstillingsevne er noen få av mange variabler som vil påvirke utviklingen i regionen de neste årene. Siden vi ikke vet om det blir reduksjon, stagnasjon eller økning i antall reisende, har vi valgt å ta utgangspunkt i trafikkbildet for 2015.

Klimaforliket har som hovedmål at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). Bypakke Nord-Jæren er byområdet bidrag til å nå nasjonale klimamål, og skal også bidra til å løse regionale og lokale utfordringer. Styringsgruppen foreslår utbygging av tiltak som skal bedre framkommeligheten, sikre mobilitet og et bedre bymiljøet for innbyggerne på Nord-Jæren. Tiltakene som foreslås skal gi en forutsigbarhet og stabilitet i utviklingen av transportinfrastrukturen i et langsiktig perspektiv, noe som vil støtte opp under byutvikling og byfornyelse på Nord-Jæren. I tillegg foreslås videreføring og oppstart av planlegging av viktige tiltak på Nord-Jæren. Utbygging av tiltak kan først startes opp etter at Stortinget har vedtatt Bypakke Nord-Jæren. Det er lagt opp til stortingsbehandling høsten 2016.

Styringsgruppen mener at Nord-Jæren har en unik mulighet til å gjennomføre tidenes byutviklingsløft igjennom samhandling på tvers av kommunegrensene i Bypakke Nord-Jæren. En felles plattform er etablert gjennom regional enighet om investeringer som skal gjennomføres de neste 15 årene. Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt i Fylkestinget 9. desember 2014. Basert på dette vedtaket skal det fram mot 2031 investeres for nærmere 22 mrd. kr. Cirka 70 % av bompengene skal brukes til kollektiv, sykkel og gange. Cirka 30 % er foreslått å gå til vegbygging.

Bypakke Nord-Jæren skal gjøre det enklere å foreta reiser på Nord-Jæren. Fram til 2031 skal det bygges en mer miljøvennlig region, og da er det avgjørende at regionen lykkes med arealutvikling som bygger opp om prioriteringene i bypakken. Et godt samspill på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå, og mellom tiltak, virkemidler og planprosesser er nøkkelen til å lykkes med Bypakke Nord-Jæren.

2. Bakgrunn

Gjennom klimaforliket vedtatt i Stortinget i 2008 og 2012, er det bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Avtalen inneholder mål for utslippsreduksjoner i 2020 og har et langsiktig mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Gjennom klimameldingen ble det lagt føringer for utviklingen av transportsystemet, dette innebærer at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). Dette skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene og styrke miljøvennlig transport i byene. Transportetatene har gjennom sitt grunnlagsdokument til NTP 2018 – 2029 omtalt nullvekstmålet som en etappe på vegen mot omstilling til lavutslippssamfunnet i 2050.

2.1 Brev fra Samferdselsdepartementet 2 juni 2014

Bymiljøavtalen er et virkemiddel som samferdselsdepartementet disponerer. Samferdselsdepartementet (SD) gav i brev datert 2. juni 2014 rammeverk og føringer for forhandlinger om bymiljøavtaler, basert på NTP 2014–2023. SD ønsker å legge til rette for oppstart av forhandlinger om en bymiljøavtale med Nord-Jæren. Avtalen vil være en forpliktende avtale mellom Staten og Nord-Jæren om å nå nullvekstmålet. Gjeldende og nye bompengoordninger vil være en del av bymiljøavtalene.

I brevet omtales bl.a. krav om at det skal foreligge en KVV for byområdet, og at regionale arealplaner skal være i tråd med målene i bymiljøavtalen. Styringssystemet og indikatorsett for oppfølging av byområdene er i tillegg omtalt.

SD legger opp til å innlemme dagens belønningsordning i bymiljøavtalen.

Bypakke Nord-Jæren vil legges til grunn for bymiljøavtalen. Bymiljøavtalen vil baseres på dagens NTP og det legges opp til reforhandling av førstegenerasjonsavtaler i 2018 basert på ny NTP 2018–2019.

2.2 Dagens bompengoordning Nord-Jærenpakken

I følge Stortingsprop. 28 S vil dagens Nord-Jærenpakke avløses av en ny bompengoordning dersom Stortinget slutter seg til dette innen fem år (2016). De økonomiske forpliktelsene knyttet til igangsatte prosjekter innenfor Nord-Jærenpakken vil da overføres til den nye bompengoordningen. Dersom det ikke blir tilslutning til en ny bompengoordning er det forutsatt at Nord-Jæren pakken opprettholdes til forutsatte bompengebidrag til igangsatte prosjekt og avviklingen av bompengoordningen er finansiert. Beregninger av årlige bompengeinntekter i Nord-Jæren pakken, og disponering av disse viser at dersom det ikke blir tilslutning til Bypakke Nord-Jæren, vil det være behov for å kreve inn bompenger i dagens ordning til høsten 2017. I tillegg vil det være behov for å kreve inn bompenger i

ytterligere 4–5 måneder i 2018 for å dekke inn utgifter til brikkedepositum og avvikling av bomstasjonene.

Det de siste 15–20 årene vært et tett samarbeid mellom kommunene på Nord-Jæren gjennom transportplansamarbeid og arbeid med Fylkesdelplan for byutvikling på Jæren og Regionalplan Jæren.

2.3 Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren ble behandlet i Fylkestinget i Rogaland 9. desember 2014. Det ble vedtatt at Bypakke Nord-Jæren blir en ny bompengepakke for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i 15 år, fra høsten 2017. Nullvekst i personbilreiser er lagt til grunn i beregningene i forslag til Bypakke Nord-Jæren. Det skal bygges 38 nye bomstasjoner som skal settes opp i fem tette ringer rundt viktige målpunkt på Nord-Jæren, samt et ytre bomsnitt på Randaberg.

Bypakke Nord-Jæren skal finansiere det konseptet som ble vedtatt av Regjeringen Stoltenberg etter KVU/KS1 for Transportsystemet på Jæren: Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 og Regionalplan Jæren er det nedfelt mål som skal styrke en mer miljøvennlig og bærekraftig persontransport. For å oppfylle mål i Klimaforliket om at veksten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, er tilrettelegging for miljøvennlig transport og arealplanlegging som reduserer transportbehovet nødvendig. Dette er lagt til grunn for utformingen av Bypakke Nord-Jæren.

Når Bypakke Nord-Jæren er fullført er blant annet dette på plass:

- Europas lengste bussvei – Bussveien
- Sykkelstamvegen fra Stavanger til Sandnes via Forus.
- Sammenhengende fire-felts E39 fra Ålgård til Harestad i Randaberg.
- Transportkorridor vest – Tungbilfelt og bussvei.

I tillegg skal det være gjennomført en rekke andre tiltak for å forbedre forholdene for reisende på Nord-Jæren

3. Mål og styring av Bypakke Nord-Jæren

3.1 Mål for Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren har to hovedmål:

- Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren
- God framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport.

I tiden etter at Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt lokalt har det skjedd mye på globalt og nasjonalt nivå knyttet til å løse klimautfordringene. Parisavtalen ble vedtatt i 2015 som den første rettslig bindende klimaavtalen globalt. Transportsektoren har gjennom dette et ansvar for å redusere klimagassutslipp og å bidra til å oppfylle klimamålene. Det må arbeides videre med å utvikle en mer utfyllende målstruktur og et resultatstyringssystem for bypakken. Dette må skje i nær sammenheng med grunnlagsarbeid for en Bymiljøavtale. Ved inngåelse av bymiljøavtale forplikter partene seg bl.a. til å rapportere om den årlige utviklingen i personbiltrafikk, transportmiddelfordeling og CO₂-utslipp. Det skal også rapporteres på innsatsområdene arealbruk og parkering. Bymiljøavtalen vil baseres på dagens NTP og det legges opp til reforhandling av førstegenerasjonsavtaler i 2018 basert på ny NTP 2018–2019.

Bypakken alene kan ikke sikre måloppnåelse, men blir med ca. 22 mrd.kr i samferdselsinvesteringer en avgjørende bidragsyter. Det er viktig å sikre en felles forståelse av hva som må til for å nå målene i Bypakke Nord-Jæren. Dette vil igjen kunne bidra til konsensus om nødvendige prioriteringer i årene framover.

3.2 Beslutningsprosesser

I en framtidig bymiljøavtale vil Nord-Jæren være avtalepart, og byområdet vil bli målt på resultater for de fire kommunene sett under ett.

Målrettet gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren krever god samhandling mellom lokale myndigheter og staten. For å ivareta dette, ble det høsten 2014 etablert en styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren. I styringsgruppen deltar Statens vegvesen v/vegdirektøren, Jernbaneverket v/jernbanedirektøren, fylkesordføreren i Rogaland fylkeskommune og ordførerne fra de fire kommunene. Fylkesmannen deltar som observatør. Gruppen ledes av vegdirektøren.

Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av prosjektporteføljen. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters


VEDLEGG 5

behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger. Styringsmodellen må tilpasses til enhver tid gjeldende forvaltningssystem.

I styringsgruppen deltar staten (ved Statens vegvesen), fylkeskommunen og representanter for kommunene. Gruppen ledes av Vegdirektøren. Styringsgruppen vedtar handlingsprogram og årlige prioriteringer. Konsensus i styringsgruppen er et viktig fundament for arbeidet med Bypakke Nord-Jæren.

På forsommeren hvert år fremmer styringsgruppen et forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren som blir lokalpolitisk behandlet i Rogaland fylkeskommune og i de fire kommunene i løpet av sommeren. Dette danner et viktig grunnlag for omtale av Bypakke Nord-Jæren i Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1S i oktober. Her presenterer Regjeringen rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger i Bypakke Nord-Jæren.

Organisering av Bypakke Nord-Jæren vises under:

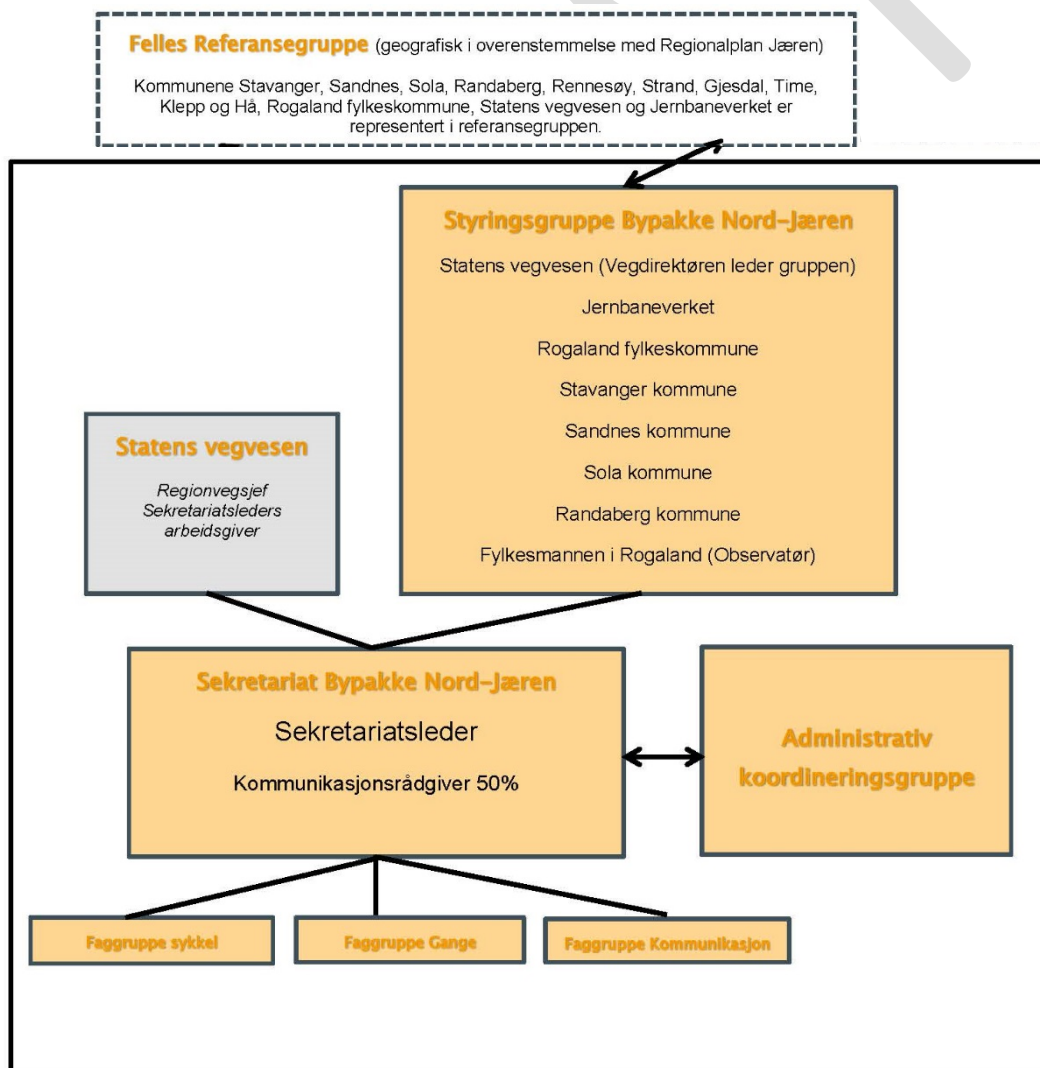

3.3 Porteføljestyring av Bypakke Nord-Jæren

Porteføljestyring innebærer at tiltak prioriteres på grunnlag av en helhetlig vurdering av følgende elementer:

- Bidrag til måloppnåelse i Bypakke Nord-Jæren
- Finansiering/Disponible midler
- Planstatus
- Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
- Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Vurdering av måloppnåelse hittil og framtidig forventet måloppnåelse vil være sentralt for prioritering av prosjekter underveis.

Resultatene følges opp og rapporteres i handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren hver vår og i statsbudsjettet hver høst. Det er lagt vekt på regelmessig kontroll av økonomi, fremdrift og eventuelle avvik i de store prosjektene.

Alle store samferdselspakker vil ha en viss grad av usikkerhet. Prosjekter kan få økte kostnader og forsinket fremdrift, og antall bompasseringer kan gå ned og gi reduserte inntekter. Etter Styringsgruppens oppfatning håndteres denne usikkerheten gjennom årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer og ved større revidering/reforhandlinger av avtalen etter behov. Det gir oppdatert beslutningsgrunnlag og mulighet til å korrigere kursen ved behov.

4. Status – byområdet Nord-Jæren

Dette kapittelet gir en omfattende statusoppdatering for byområdet Nord-Jæren. Dette er det første handlingsprogrammet til styringsgruppen og er derfor lagt vekt på å gi en god oversikt over situasjonen på Nord-Jæren når det gjelder viktige områder som påvirker måloppnåelsen i Bypakke Nord-Jæren.


4.1 Befolkningsutvikling

Felles bolig- og arbeidsregion bestående av 10 kommuner er hjem til ca. 330.000 i 2015. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst har vært på ca. 1.7 % siden 2000. Kommunene på Nord-Jæren har til sammen ca. 240 000 innbyggere.


VEDLEGG 5

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan antall og sammensetningen av befolkningen vil utvikle seg. Denne usikkerheten øker jo lenger fram i tid en ser. Som grunnlag for planlegging er det nyttig å vurdere konsekvensene ved alternative scenarier.

Alternative regionale scenarier for befolkningsutvikling basert på forskjellige økonomiske vekstbaner, samt forutsetninger om fruktbarhet, levealder m.m., gir et begrep om hvordan framtidig befolkningsvekst og struktur kan se ut. Hovedscenariet (middelalternativet) legger til grunn at regionens befolkning vil vokse med ca. 170.000 nye innbyggere innen 2050. Dette forutsetter en god økonomisk utvikling samt høy netto innvandring.

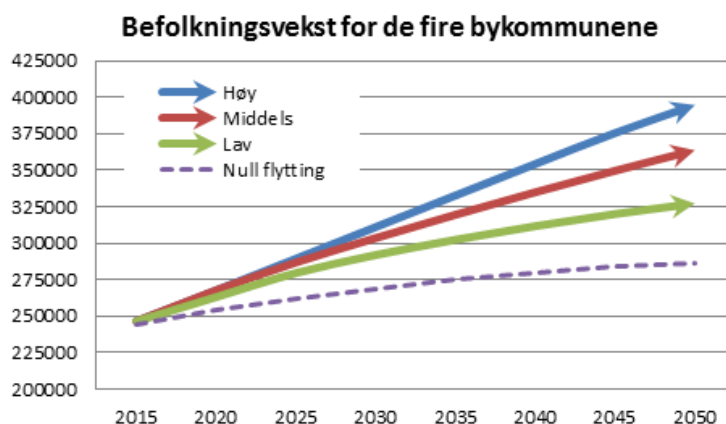

Figuren viser de alternative prognosene for befolkningsutvikling i de fire kommunene som utgjør byområdet.

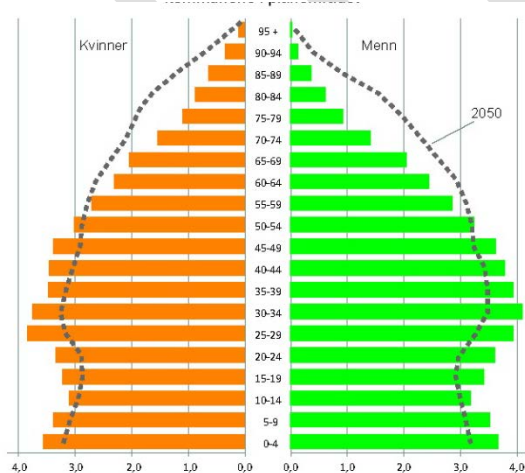

Regionen, som landet for øvrig, vil få en eldrebølge i perioden framover. De store årskullene i årene etter andre verdenskrig øker nå andelen innbyggere over 67 år. Med utgangspunkt i hovedscenariet for befolkningsutvikling nevnt over, står regionen foran en sterk økning i både antall og andel eldre i perioden fram til 2050.

Det kan dermed forventes å bli en andelmessig reduksjon i alle aldersgrupper under 55 år.



VEDLEGG 5

Regionen har blitt mer multinasjonal. Netto-innvandringen til regionen har vært svært høyt sammenlignet med tidligere perioder.

Rekordhøy arbeidsinnvandring fra EØS land, spesielt i høykonjunktoren etter 2007, har vært den viktigste årsaken til de siste års befolkningsvekst.

Innvandring kan gi positive ringvirkninger for regionens utvikling ved at det gir en yngre befolkning og dermed øker antall i arbeidsfør alder. Innvandringen har vært sterkt konsentrert til alderssjiktet 20–39 år.

Men mange har også flyttet fra regionen i perioden og det har vært en negativ flyttetrend for innenlands flytting siden 2007.

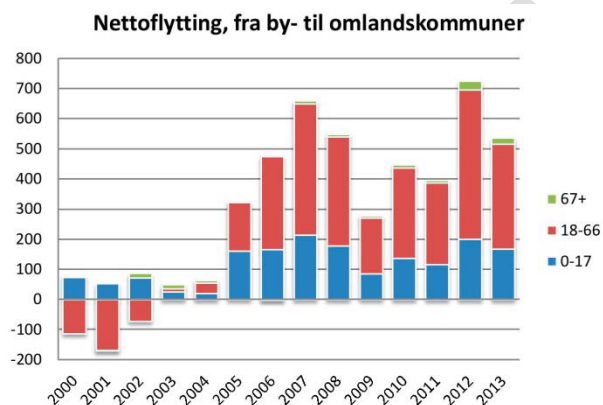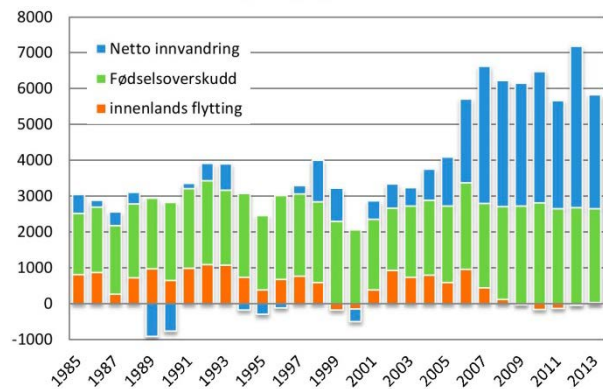

Flyttestrømmene internt i regionen snudde på begynnelsen av 2000-tallet, fra å være netto flytting fra omlands- til bykommunene, ble det netto flytting fra by- til omlands-kommuner. Trenden har vært spesielt tydelig siden 2005.

I tillegg har flere av omlandskommuner hatt en sterk prosentvis vekst i perioden.

4.2 Trafikkutvikling

4.2.1 Personbil

Personbiltrafikk er i perioden 2012–2015 målt ved 8 registreringspunkter på Nord Jæren:

- Rv. 509 på Madla,
- Fv. 44 i Hillevågstunnellen,
- Fv. 44 ved Skjæringen,
- Fv. 509 Oalsgata,
- Bybrua,
- Bergelandstunnellen,
- Tanke Svilandsgate
- E39 Auglend.

Trafikktellingene viser at det har i hele byregionen vært en nedgang i personbiltrafikken på ca. –1% det siste året, mens utviklingen i forhold til referanseåret 2012 viser en økning på 1,3%.

En noe større økning av personbiltrafikken ved Hillevågstunnellen kan trolig ses på som konsekvens av anleggstrafikken knyttet til Ryfastutbygging og kø i Madlaveien, samt bussveibygging og belastning på Fv44. Etter den kraftige økningen i Tanke Svilandsgate i fjor på grunn av stengning av E39, har trafikken det siste året stabilisert seg.

Resten av tellepunkter har hatt en nedgang i personbiltrafikken i 2015 sammenlignet med 2014. I tillegg, viser trafikktall for passeringene gjennom bomringen på Nord Jæren en nedgang på –1,9% fra 2014 til 2015.

Det er stor vegbyggingsaktivitet i regionen akkurat nå. Anleggstrafikken knyttet til byggeprosjekter fører til betydelige endringer i kjøremønster i byregionen. Dette kan påvirke utviklingen på de utvalgte tellepunktene.

	ÅR	ÅDT	Endring 2014–2015	Endring 2012–2015
Fv509 Madla	2012	14658	-2,17	3,08
	2013	15108		
	2014	15445		
	2015	15110		
Fv44 Hillevågstunnellen	2012	14560	1,99	3,54
	2013	14599		
	2014	14782		
	2015	15076		
Fv44 Hillevåg Skjæringen	2011	14982		
	2012	Anlegg		
	2013	Anlegg		
	2014	Anlegg		
	2015	15644		
Fv509 Oalsgata	2012	15408		
	2013	15115		
	2014	15092		
	2015	mangler		
Fv435 Bybrua sør	2012	17604	-1,41	-3,20
	2013	17501		
	2014	17284		
	2015	17040		
Fv509 Bergelands tunnelen	2012	18848	-2,25	-5,11
	2013	19828		
	2014	18295		
	2015	17884		
Fv446 Tanke Svilandsgt	2012	5605	0,64	33,90
	2013	6679		
	2014	7457		
	2015	7505		
E39 – Auglend	2012	63478	-1,10	0,69
	2013	64877		
	2014	64631		
	2015	63920		

Selv om den store anleggstrafikken skaper til dels store trafikkproblemer, kan dette også på sikt bidra positivt til en omlegging av reisevaner byområdet.

4.2.2 Kollektivtransport

Buss

Tabellen viser utviklingen i antall påstigende busspassasjerer i storbyområde som omfattes av dagens belønningsordning, samt de omkringliggende kommunene Randaberg, Rennesøy og Gjesdal.

Kommune	2012	2013	2014	2015
Stavanger	11.770.000	11.740.000	11.650.000	11.620.000
Sandnes	3.650.000	3.950.000	4.050.000	4.040.000
Sola	810.000	850.000	890.000	800.000
SUM avtalekommunene	16.230.000	16.540.000	16.590.000	16.460.000
Omkringliggende kommuner	900.000	960.000	1.000.000	1000.000
SUM	17.130.000	17.500.000	17.590.000	17.460.000

Den prosentvise utviklingen i antall busspassasjerer det siste året, fra 2014 til 2015, og i forhold til referanseåret 2012 vises i følgende tabell.

Kommune	2014–2015	2012–2015
Stavanger	–0,3%	–1,29%
Sandnes	–0,3%	10,77%
Sola	–9,8%	–0,84%
SUM avtalekommunene	–0,8%	1,44%
Omkringliggende kommuner	–0,9%	10,47%
SUM	–0,9%	1,92%

For 2015 viser Stavanger og Sola en negativ utvikling i forhold til referanseåret 2012 og alle kommunene viser en negativ utvikling i forhold til 2014. At antall busspassasjerer totalt sett har sunket i løpet av 2015, skyldes en svak nedgang i antall reisende i første kvartal 2015. De øvrige kvartalene i 2015 viser en positiv utvikling i forhold til tilsvarende perioder i 2014.

Tog

Tog statistikken bygger på passasjertellinger for lokaltog på Jærbanen som NSB AS foretar hver høst. Tellingen omfatter alle på- og avstigende passasjerer per stasjon på alle avganger på utvalgte hverdager i uke 38 (mandag, tirsdag og torsdag). Passasjerer på regiontog mellom Stavanger og Oslo er ikke inkludert i tellingen.

Antall påstigende og avstigende passasjerer per togstasjon fra Stavanger til Egersund per

VEDLEGG 5

hverdag høsten 2012, 2013 og 2014 er aggregert til å gjelde byområdet og resten av Jæren regionen.


Strekning	Høst 2012	Høst 2013	Høst 2014	Høst 2015
Stavanger – Ganddal	15.914	17.077	17.389	
Øksnevadporten – Nærbø	7.121	7.557	7.568	

NSB understreker at utvalgsbaserte passasjertellinger alltid vil være utsatt for tilfeldige svingninger eller spesielle hendelser som kan påvirke representativiteten på telleresultatene, selv om nøyaktigheten på tellingene er høy. Tellingene høsten 2012, 2013 og 2014 gir et øyeblikksbilde av trafikksituasjonen i undersøkelsesperioden.

Statistikken over togpassasjerer i 2015 vil først bli tilgjengelig på våren 2016.

4.2.3 Sykkel

Gjennom etablerte tellepunkt registreres sykkeltellinger ved Kannik og Bybrua i Stavanger, Sømmevågen i Sola, Lura, Vassbotn og Soma skole i Sandnes. 2014 hadde stor vekst (14,5%), dermed en liten normalisering i 2015 (-2,6%).

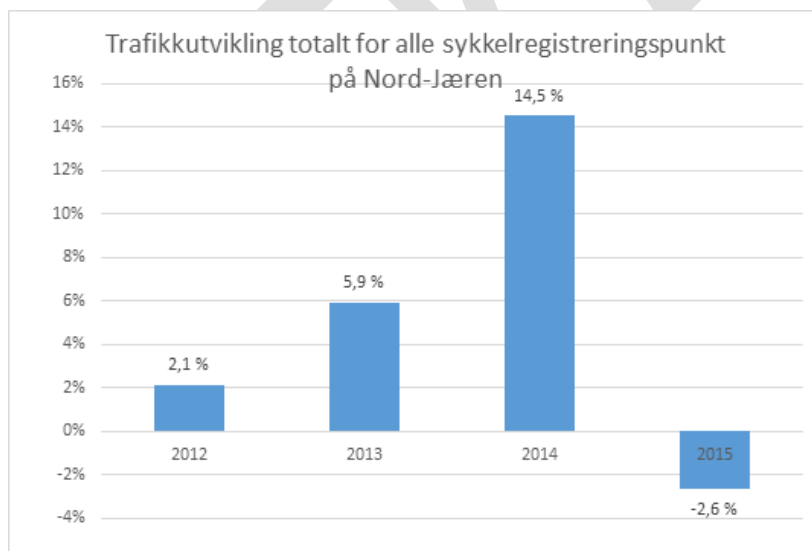

Gjennomsnittlig økning er 6,2 % pr år, når alle tellepunktene slås sammen.

4.4 Miljø – støy og luft

4.4.1 Støy

Den største kilden til støy i Stavanger og Sandnes er fra vegtrafikken fra E39 og en del riks- og fylkesveger. Trafikk på noen kommunale veger forårsaker også støy. Jernbanen gir støy langs banen fra Sandnes sentrum til Stavanger. Flytrafikken til og fra Sola flyplass gir støy i Sola og i deler av Stavanger kommune.

Forebyggende fysiske tiltak mot støy gjennomføres hovedsakelig av Statens vegvesen. Det gjennomføres tiltaksutredning etter forurensningsforskriften, og støytiltak etter T-1442 Støyretningslinjene i vegprosjekt. Videre vedlikeholdes støyskjermer langs riks- og fylkesveier slik at disse fungerer optimalt.

4.4.2 Lokal luftkvalitet

Miljødirektoratet har vurdert Stavanger kommunes tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Tiltaksutredningen tilfredsstiller i stor grad kravene til tiltaksutredninger og viser at grenseverdien for nitrogen dioksid (NO₂) og svevestøv (PM₁₀) vil kunne overholdes mot 2020 om de anbefalte tiltakene gjennomføres for PM₁₀. På bakgrunn av mangel på politisk vedtatte tiltak vil det være fare for brudd på grenseverdien for PM₁₀ frem mot 2020 og Miljødirektoratet har bedt kommunen om revidert tiltaksutredning inkludert handlingsplan for PM₁₀ innen 1. mai 2016.

På Nord-Jæren finnes to målestasjoner for luftkvalitet og begge disse er plassert i nærheten av Stavanger sentrum. Den ene er plassert tett opp til hovedfartsåren Madlaveien ved Kannik, mens den andre er plassert i et nærliggende bybakgrunnsområdet på Våland.

I begge stasjonene måles det svevestøv (PM₁₀ og PM_{2,5}), nitrogen dioksid (NO₂) og karbonmonoksid (CO). Luftforurensningen måles kontinuerlig gjennom hele døgnet i målestasjonene. Formålet med målingene er i første rekke å gi befolkningen informasjon om den aktuelle luftkvaliteten. Gjennom varslene får befolkningen prognoser for morgendagens luftkvalitet og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.

For 2015, viser foreløpige data at vi hadde 16 av totalt 50 tillate døgn over grenseverdien på svevestøv pm₁₀. Årsgjennomsnittet på pm₁₀ var 22,2 mikrogram/m³, hvor grenseverdien er 40 mikrogram/m³ luft. For NO₂ var det ingen overskridelser på timesverdiene. Årsgjennomsnittet var her på 33,9 mikrogram/m³, hvor grenseverdien er på 40 mikrogram/m³.

Luftforurensning kan forårsake symptomer og sykdom i forskjellige deler av luftveiene og lungene, samt forverre allerede eksisterende lungesykdom og føre til dødsfall. Det er mange

studier som viser en sammenheng særlig mellom svevestøv, nitrogendioksid eller ozon og helseeffekter i luftveier og lunger.

4.5 Framkommelighet

4.5.1 Sykkel

Framkommeligheten på dagens tilbud er preget av variabel standard og kun enkelte lengre sammenhengende strekninger med god kvalitet.

Sykkeltilbud	Antall kilometer totalt
Gang- og sykkelveg	164,2
Sykkelveg med/uten fortau	1,1
Sykkelfelt	24,9
Sysselgate	–
Turvei	14,1
Sykling i blant trafikk	60,3
Total	264,6

Tabell 4.5.1: Sykkeltilbudet langs Nord-Jærens sykkelvegnett i 2016.

Figur 4.5.1: Byområdet som er skyggemarkert oransje viser krav til separasjon fra kjørende og gående i Regionplan Jæren 2013–2040.

Regionalplan for Jæren 2013–2040 stiller krav til separerte løsninger for gående og syklende på store deler av Nord-Jæren. Tabell 1 viser at over 60 % av sykkelvegnettet er delt løsning: gang- og sykkelveg. I tillegg kommer sykling i blandet trafikk. Det er ikke tilrettelagt for å ta med sykkel om bord på kollektivtransport. Muligheten for å parkere sykkel på en enkel og sikker måte ved holdeplasser og kollektivknutepunkt er begrenset.



4.5.2 Gange

Gåing er den mest brukte og den mest grunnleggende måten å bevege seg på. I tillegg til å fremstå som en egen, selvstendig transportform, er gange også en naturlig del av de fleste reiser sammen med de andre transportmidlene.

Pr. i dag finnes lite data om gåing. I reisevaneundersøkelser er data om gåing fragmentert. Vi vet lite om antall fotgjengere på fortauene og ved kryssingspunktene i byen.

Framkommeligheten på dagens tilbud er variabel.

Dagens tilbud for gående i byområdet er i stor grad bygget langs biltrafikkerte veger og gater, som for mange oppleves som lite attraktive. Forskning viser at opplevelsen av avstand er subjektiv (Helge Hillnhütter, 2016). Alle sanseorganer brukes i større grad aktivt av


gående enn andre trafikantgrupper. Langs monotone traséer som er støyutsatt og luftforurenset av motorisert trafikk oppleves avstand lenger enn i omgivelser som preges av opplevelseshemning. Det er liten grad av separering mellom gående og syklende, som kan oppleves utrygt for begge trafikantgrupper. I sentrumsområdene er det flere steder mangelfulle lenker i tilbudet til gående, som fører til ulogiske gangtraséer. Dette er spesielt problematisk for syns- og bevegelseshemmede.

Byområdet har flere attraktive turområder, hvor de mest populære er parkområder og grønne stier rundt vannene. Noen turområder brukes også som en del av hverdagsreisen for gående.

4.5.3 Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikkens fremkommelighet er i prinsippet den samme som personbiltrafikkens, med unntak av de stedene man har etablert kollektivfelt. Figuren under viser utviklingen i reisehastighet for busstrafikken, rute 2 mellom Stavanger og Sandnes og rute 9 mellom Stavanger og Risavika, begge retninger i rushtid i perioden 2004–2012. På grunn av økende biltrafikk og tilhørende økende avviklingsproblemer, ser man at bussenes hastighet har en klart nedadgående trend, med over 28 km/t i 2004 og 24 km/t i 2012. Dette til tross for at det langs deler av traséene er etablert kollektivfelt i denne perioden.

Den dårlige fremkommeligheten for kollektivtrafikken medfører både økte forsinkelser og redusert pålitelighet for bussene, hvilket igjen svekker kollektivtrafikkens konkurransekraft mot privatbil.

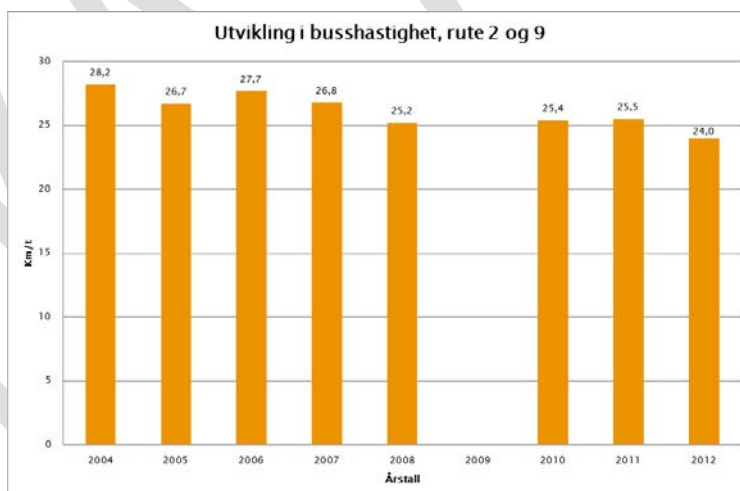

4.5.4 Næringslivets transporter

Ved siden av persontransport er transport av gods og varer den andre store type transport. Gods- og varetransport er avgjørende for samfunnets funksjon. Transportene drives av vekst i økonomisk aktivitet og befolkning. Effektive transporter er en forutsetning for et samfunn med mål om effektiv produksjon og økonomisk vekst. Transport innebærer også ulemper for samfunnet, særlig knyttet til ulykker og miljøskade.

Det regionale utbyggingsmønsteret de senere årene er ikke blitt bygget godt nok opp om sentre, knutepunkter og kollektivakser til at en har fått noen vesentlig nedgang i andelen bilturer. Når det totale transportomfanget i tillegg øker, finner en dette igjen i form av en voksende biltrafikk.

Den økende biltrafikken fører ikke bare til miljøproblemer i form av støy, støv og luftforurensing, redusert trafikksikkerhet men også til dårligere punktlighet/regularitet og økte driftskostnader for næringstrafikk.

Det er særlig i rushperiodene om morgen og ettermiddagen der framkommelighet er et dominerende problem. Transportnæringen påpeker at det ikke bare er hovedvegnett som har framkommelighetsproblemer, men hele vegnett. Ved siden av framkommelighetsproblemer pga. et overbelastet vegnett er trange sentrumsgater og dårlige varemottak ved butikker en stor utfordring for varetransport/distribusjon av varer i byområdet.

4.5.5 Personbiltrafikk

Tidligere var Forus-området, som er midt på Nord-Jæren, sett på som en 15-minutters biltur unna for stort sett alle på Nord-Jæren. Ettersom byområdet har vokst og næringsklyngen på Forus har fordoblet seg flere ganger er det nå store framkommelighetsproblemer på Nord-Jæren. Rushet er større inn mot Forus om morgenen enn det er mot Stavanger og Sandnes sentrum. Det samme gjelder for ettermiddagsrushet, det er størst ut fra Forus, og noe mindre ut fra de to bysentra.

Vi har sann reisetidsmåling på E39 og rv. 509. Reisetiden på E39 gjenspeiler grovt sett reisetiden på det øvrige vegnettet også, siden trafikken finner den raskeste ruten, tar det stort sett like lang tid å parallele veger som på E39. Vi kan derfor anta at reisetid på E39 gjenspeiler reisetiden på fylkesveg- og kommunalvegnettet også.

Fra Tjensvoll i Stavanger til Bogafjell i Sandnes tar det om lag 15 minutter å kjøre utenom rushtidene. For morgenrushet har det blitt en bedring i reisetiden de to siste årene, siden trafikkmengden har redusert seg med 1,5 % mellom Stavanger og Forus. Når trafikkmengden vipper rundt kapasitetsgrensen vil små endringer kunne gi store utslag for reisetiden. For ettermiddagsrushet er reisetiden noenlunde lik de tre siste årene. Dette fordi trafikkmengden i sørgående retning, fra Forus mot Sandnes, har vært økende frem til 2014 og en liten nedgang i 2015. Anleggsvirksomhet på strekningen Sandved – Hove har også hatt noe innvirkning for 2015.

E39 nordover har størst reisetid om morgenen fra Bogafjell mot Forus. En ser utfra registreringer for de siste 4 årene at forsinkelsene har økt fra omkring 10–15 min i 2012 og 2014 til omkring 15–25 min i 2015. 2012 tallene er hentet fra kjøring med GPS i biler i forbindelse med en førregistrering før åpningen av rv. 509 Solasplitten. Ettermiddagsrushet har holdt seg noenlunde stabilt med 5–10 minutters forsinkelse som vanligvis oppstår mellom Forus og avkjøringen til Hinna.

Trafikkutviklingen på Nord-Jæren har vært sterkere enn for Rogaland generelt. F.eks. på E39 Auglendshøyden har trafikkveksten vært på hele 4 % i gjennomsnitt, siden vegen ble åpnet på 70-tallet. De to siste årene har det derimot vært en nedgang pga. generell nedgang ellers i samfunnet.

4.6 Nullvekst i persontransporten

Nullvekstmålet er tidligere omtalt i handlingsprogrammet. Under gis en status på hvordan Nord-Jæren ligger an i forhold til å nå målet.

For perioden fra 1998 til 2014 foreligger sammenlignbare analyser som gir grunnlaget for å beskrive utviklingen i transportmarkedet på Nord-Jæren.

Markedsandelene i prosent for de ulike transportmidlene på Nord-Jæren har utviklet seg som vist i tabellen nedenfor.

År	Til fots	Sykkel	Bilfører	Bilpassasjer	Kollektivt	MC/annet
1998	15	6	61	7	8	2
2014	20	7	57	7	9	1

Tabell x: Markedsandelene i prosent for transportmidlene på Nord-Jæren fra lokal og nasjonal RVU.

Tabellen viser at Nord-Jæren har opplevd en relativ nedgang i biltrafikken ved at andelen turer som bilfører har gått ned med fire prosent, mens de miljø- og byvennlige transportformene har gått tilsvarende opp. Særlig interessant er veksten i trafikken til fots.

Denne utviklingen vurderes som positiv tatt i betraktning av at regionen i samme perioden opplevde en historisk sett høy materiell velferdsvekst. En slik utvikling bidrar vanligvis til å svekke de gående og kollektivtrafikkens konkurransesituasjon. Økt materiell velferd har oftest vært ensbetydende med økte markedsandeler for personbiltrafikken.

Allikevel har endringene i reisemiddelvalget i perioden fra 1998 til 2014 ikke vært nok til å begrense selve veksten i antall personbilturer. Regionens høye befolkningsvekst i samme perioden har bidratt at alle transportmidlene har opplevd en vekst i absolutte tall, og den veksten har tallmessig sett vært størst for personbilturene.

Nord-Jæren står dermed foran en stor utfordring når vi fra 2017 av skal styre utviklingen av transportsektoren i henhold til målet om nullvekst i personbiltrafikken, dvs. at antall personbilturer må holdes på samme nivå som i 2015.

4.7 Arealbruk og parkering

4.7.1 Arealbruk

Arealbruk, byens fysiske form og funksjonslokalisering, er sterkt korrelert med innbyggernes reisebehov og reisemiddelvalg. Dagens spredte bystruktur på Nord-Jæren, med lav fysisk og funksjonell tetthet, er blant annet et direkte resultat av mobilitetsøkningen muliggjort av at

bilen ble allemannseie. Utviklingsparadigmet med spredt bygde eneboliger og soneplanlagte næringsområder gir i dag et storbyområde som er vanskelig å betjene på en effektiv måte med kollektivtransport og som i liten grad innbyr til gåing eller sykling.

Som forutsetning for inngåelse av en bymiljøavtale har Staten i Nasjonal Transportplan 2014–2023 stilt krav om at storbyområdene skal ha vedtatt eller vedtatt revidert en regional arealplan som er i tråd med nullvekst målet. Gjeldende regionalplan har ikke blitt utviklet med nullvekstmålet som forutsetning og må dermed oppdateres.

Planen viderefører utviklingsmodellen fra tidligere fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren som gir grunnlag for en kollektivbasert utvikling. Imidlertid har det vært mye utbygging i perioden 2000 til 2014 som ikke er samordnet i tid med utviklingen av transportsystemet. Andelen boliger og sysselsatte som er lokalisert innenfor influensområdet til et senter, og/eller en hovedrute for kollektivtransport, har blitt redusert. For å bøte på konsekvensene av etablering av boliger, arbeidsplasser og besøksintensive virksomheter utenfor hovedrutene for kollektivtransport, er det opprettet et omfattende kollektivtilbud med mange ekstraruter. Resultatet er en ruteproduksjon som ligger høyt i europeisk sammenheng.

Det har også vært utfordringer med hensyn til arealutnyttelse. Det bygges fortsatt med for lav tetthet i områder med god tilgjengelighet. Store bilbaserte boligområder med lav tetthet er utviklet, og under utvikling, "i tråd med" gjeldende planverk. Noen soner i planens rekkefølge for utbygging av boligområder er heller ikke samordnet med forslag til Bypakke Nord-Jæren. Dette er noe av grunnlaget for at Rogaland fylkeskommune sendte forslag til Regional planstrategi for 2017–2020 på høring i oktober 2015 med forslag om å oppdatere Regionalplan for Jæren. Anbefalingen begrunnes blant annet med behov for å sikre at planen er i tråd med "nullvekstmålet". Forslaget har fått full oppslutning i høringsuttaalelsene. Regional planstrategi vedtas av fylkestinget 26. april.

4.7.2 Parkering

Parkeringsrestriksjoner er et effektivt virkemiddel for å redusere bilbruk. Det er en direkte sammenheng mellom tilgang til rimelig eller gratis parkering og sannsynligheten for å bruke bil. Oppnåelse av nullvekstmålet forutsetter bruk av bilrestriktive tiltak, og spesielt parkering som virkemiddel er forventet å være en motsats til statens investeringer. Parkering er valgt som en av to innsatsområder knyttet til arealbruk som skal måles innenfor bymiljøavtalene. I storbyområdet er tilrettelegging for parkering geografisk skjevfordelt noe som er særlig problematisk når hovedvekten av regionens nye arbeidsplasser det siste tiåret kom på Forus/Lura som har byområdets minst restriktive parkeringspolitikk.

VEDLEGG 5

Parkeringspolitikken i Regionalplan for Jæren er delvis operasjonalisert gjennom kommuneplanarbeid og mange områder har fått innskjerpet parkeringskrav. «Utvikling av en regional parkeringspolitikk» var en av oppfølgingsoppgavene vedtatt i den første fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren for 15 år siden. Det er videre bekreftet i gjeldende regionalplan at en regional samordning av parkeringspolitikken ansees å være en forutsetning for ønsket måloppnåelse. Arbeid med dette oppfølgingspunktet er ennå ikke påbegynt.

5. Status for tiltak Bypakke Nord-Jæren

Sykkelstamvegen og Bussveien er to viktige tiltak i Bypakke Nord-Jæren. Delstrekninger i disse prosjektene er allerede under utbygging. På Bussveiens nord-sør akse mellom Stavanger og Sandnes sentrum er enkelte delstrekninger ferdig bygget, og enkelte er under bygging. Disse strekningene er finansiert gjennom dagens bompengepakke, Nord-Jærenpakken og belønningsmidler. En delstrekning av Sykkelstamvegen bygges nå langs E39 i Stavanger gjennom Ryfastprosjektet.

Flere av prosjektene foreslått i Bypakke Nord-Jæren er under planlegging. Under vises en oversikt over planstatus på alle tiltak i bypakken:

Prosjekt	Planstatus	Forventet reguleringsplanvedtak
Vegprosjekter		
E39 Ålgård – Hove	Kommunedelplan vedtatt sommeren 2015, reguleringsplanarbeid i ferd med å starte opp	1. kv.2018
Fv. 505 Foss Eikeland – E39	Kommunedelplanarbeid pågår	4. kv. 2019
E39/rv. 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland	Reguleringsplanforslag er oversendt kommunen for videre behandling	2. kv. 2016
E39 Smiene – Harestad	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kv. 2017
E39 Harestadkrysset	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kv. 2017

VEDLEGG 5

Prosjekt	Planstatus	Forventet reguleringsplanvedtak
Transportkorridor vest		
Rv. 509 Sømmevågen – Sundekrossen	Reguleringsplanforslag oversendt kommunen	1. kv. 2016
Fv. 409 Sundekrossen – Finnestadgeilen	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kv. 2017
Bussveien		
Risavika havn – Tankveien	Reguleringsplanarbeid startes opp januar 2017	1. kv. 2022
Rv. 509 Tankveien – Sundekrossen	Reguleringsplanforslag oversendt kommunen	2. kv. 2016
Fv. 375 Tananger ring	Reguleringsplanarbeid startes opp august 2016	2. kv. 2023
Fv. 409 Sundekrossen – Kvernevik ring	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kv. 2017
Fv. 445 Kvernevik ring	Reguleringsplanarbeid startes opp september 2016	1. kv. 2023
Rv 509 Sundekrossen – Mosvannet	Reguleringsplanarbeid startes opp juni 2016	3. kv. 2022
Fv. 509 Mosvannet – Hillevåg	Reguleringsplanarbeid startes opp april 2016	3. kv. 2018
Fv. 44 Stasjonsveien – Diagonalen	Reguleringsplanarbeid pågår	3. kv. 2017
Fv. 44 Diagonalen–Gausel stasjon	Reguleringsplanforslag har vært ute på offentlig ettersyn	3. kv. 2016
Fv. 44 Gausel stasjon– Hans og Gretestien	Reguleringsplanforslag har vært ute på offentlig ettersyn	1.kv. 2017
Stokkaveien – Ruten	Silingsrapport og planprogram skal til politisk behandling 2. kvartal 2016.	3. kv. 2018
Fv. 332 Ruten – Vatnekrossen	Reguleringsplanarbeid startes opp april 2016	1. kv. 2020

VEDLEGG 5

Prosjekt	Planstatus	Forventet reguleringsplanvedtak
Fv. 350 Kollektivbroen – Åsenveien	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kv. 2017
Åsenveien – Sola sentrum	Reguleringsplanarbeid pågår	
Sola sentrum – Sola lufthavn	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Andre kollektivtrafikktiltak		
Rv. 509 Solasplitten: Kollektiv-/tungbilfelt	Deler av strekningen er ferdigregulert. For resten av strekningen er ikke reguleringsplan igangsatt	
E39 Solasplitten – Hinna – Schancheholen: Kollektivfelt	Mulighetsstudie som skal ligge til grunn for reguleringsplan er under utarbeidelse	
Fv. 44 Hillevåg – E39 Tjensvoll – fv. 402 UiS	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Fv. 402 UiS – E39 Diagonalen – fv. 44 Gauselvågen: Kollektivfelt og g/s	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Fv. 330 Hoveveien Nord: Kollektivfelt	Reguleringsplanarbeid pågår	
Fv. 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Sykkelstamveg Stavanger–Sandnes		
E39 Schancheholen – Sørmarka	Reguleringsplanforslag til sluttbehandling	1. kv. 2016
E39 Sørmarka – Smeaheia	Reguleringsplan vedtatt 12.01.2015	–
E39 Smeaheia – Oalsgata	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kv. 2017

6. Forutsetninger for handlingsprogram 2017–2020

6.1 Nasjonale føringer

Staten har gitt føringer for Bypakke Nord-Jæren gjennom NTP 2014–2023 og brev fra SD, datert 2. juni 2014. Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.

Transportetatene la 29. februar 2016 fram sitt grunnlagsdokument for NTP 2018–2029. Der foreslås en klimastrategi. I denne strategien foreslås en utvidelse av nullvekstmålet, og at det skal legges til rette for arealbruk som reduserer transportbehovet. Transportetatene legger til grunn at det skal tilbys god mobilitet for personer og gods, men mobiliteten skal være klimavennlig. Tiltak for kollektiv, gåing og sykling, og andre tiltak for å nå nullvekstmålet prioriteres høyt av transportetatene.

I transportetatenes grunnlagsdokument skisseres en rekke virkemidler for de fire største byregionene deriblant Nord-Jæren. Et av virkemidlene er bymiljøavtalene som ble lansert i NTP 2014–2023. Avtalene innebærer gjensidig forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommune for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Det skal tas utgangspunkt i de eksisterende bypakkene, og valg av virkemidler tilpasses lokalt. Det er likevel noen klart definerte felles rammer for og krav til avtalene. Rammeverket for avtalene ble omtalt i NTP 2014–2023 og ytterligere konkretisert i brev fra Samferdselsdepartementet 2. juni 2014.

Ved inngåelse av bymiljøavtale forplikter partene seg til å rapportere om den årlige utviklingen i personbiltrafikk, transportmiddelfordeling og CO₂-utslipp. Det skal også rapporteres på innsatsområdene arealbruk og parkering. Det er trafikkutviklingen som er styringsindikatoren. Målet om nullvekst for personbiltrafikk gjelder samlet for alle kommuner som omfattes av avtalen. Trafikkutviklingen skal måles i et hensiktsmessig avgrenset område. Måloppnåelse må skje innen avtaleperiodens utløp, men trafikkutviklingen skal følges år for år for å sikre at den går i riktig retning.

Reforhandlinger av første generasjons avtaler kan være aktuelt fra 2018, det vil si etter at Stortinget har behandlet NTP 2018–2029.

Interkommunale eller regionale areal- og transportplaner skal legges til grunn ved inngåelse av bymiljøavtale. For å følge opp arealdimensjonen i bymiljøavtalene i de fire største byområdene er byutviklingsavtaler lansert som et verktøy. En slik avtale kan forplikte partene til mer samordnet areal- og transportplanlegging. Byutviklingsavtaler er under utarbeidelse i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og rammeverket for disse avtalene er på nåværende tidspunkt ikke kjent.

6.2 Bompengeselskap

Proessen med å etablere regionale bomselskaper er i gang i dialog med samferdselsdepartementet. Rogaland fylkeskommune samarbeider med Sogn og Fjordane, Hordaland, Vest- og Aust-Agder fylker sammen om etablering av et regionalt selskap. Etableringen av selskapet forventes å skje innen rimelig tid før Bypakke Nord-Jæren vil være driftsmessig etablert. Bypakke Nord-Jæren vil være en av de første pakkene hhv. prosjekt som legges inn i det nye bomselskapet.

6.3 Finansiering

Under omtales finansiell status for Bypakke Nord-Jæren. Styringsgruppens ønske om å realisere store prosjekt tidlig i handlingsprogramperioden forutsetter låneopptak. Statlig bidrag til bypakkeprosjektene i handlingsprogramperioden er uavklart, og vil bli vurdert og fastsatt i bymiljøavtalen og i ny Nasjonal transportplan 2018–2029. Denne planen vedtas først i juni 2017. Bomstasjonene kan stå klar til innkreving årsskiftet 2017/2018, gitt at Stortinget vedtar bypakken høsten 2016. Bominntekter kan først påregnes i 2018.

6.3.1 Nasjonal transportplan 2014–2023

Følgende prosjekter i Bypakke Nord-Jæren er prioritert i gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023 og Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017:

- E39 Smiene – Harestad: 760 mill. kroner i statlig midler og 580 mill. kroner bompenger i perioden 2018–2023
- E39 Ålgård – Hove: 1 150 mill. kroner i statlige midler og 1 520 mill. kroner bompenger i perioden 2018–2023
- Sykkeltstamvegen: 62 mill. kroner i statlige midler innenfor rammen til programområdetiltak i 2015

6.3.2 Forutsetninger i fylkestingets vedtak desember 2014.

Fylkestinget i Rogaland har i sitt vedtak av forslag til Bypakke Nord-Jæren datert 9. desember 2014 lagt fram følgende finansielle forutsetninger som må avklares i bymiljøavtaleforhandlingene.

- Bypakkens investeringsprofil skal sikre at om lag 70 prosent av bompengene brukes på kollektivtrafikktiltak, tiltak for sykkel og gange og ca. 30 prosent vil brukes til veibygging.

- Staten bidrar med minimum 50 prosent andel av investeringskostnadene i høyverdig kollektivinfrastruktur.
- Staten bidrar med minimum 50 % av økte driftskostnader ved etablering av Bussveien. Uten økte statlige bidrag vil det måtte vurderes bruk av bompenger til drift når høyverdig kollektivtilbud er etablert.
- Transportkorridor Vest inngår som en del av bymiljøpakken.
- Staten bidrar til finansiering av eget bussfelt på E39 på strekningen Schancheholen – Solasplitten.
- Staten bidrar med inntil 50 % av Sykkelstamvegen
- Økte statlige bidrag vil benyttes til reduksjon av bomsatsene.

6.4 Kapasitet planlegging, kompetanse og samhandling

En forutsetning for gjennomføring av handlingsprogrammet er at det avsettes nok ressurser til planlegging, bygging og koordinering av bypakkeprosjekt. Det er behov for planmidler til flere prosjekt samt felleskostnader og drift av sekretariat. Det må sees nærmere på ressursituasjonen totalt sett i forhold til ønsket planvolum. Det kreves betydelig med ressurser til planlegging av de store prosjektene, men også planlegging av viktige programområdetiltak i byområdet vil kreve oppfølging fra alle parter. Kapasitetsutfordringer hos de ulike involverte partene er allerede varslet, og det meldes om tilsvarende utfordringer i konsulentmiljøet som leverer tjenester. Det er få tilbydere på oppdrag som nylig har vært konkurranseutsatt.

Administrativt må det jobbes videre med å finne konstruktive løsninger for effektiv samhandling. Det må sees nærmere på en best mulig arbeidsfordeling mellom sekretariat, administrasjon hos den enkelte part og i prosjektene. Grensesnitt mellom bypakkesekretariatet og kommune/fylke må optimaliseres og defineres.

Et sentralt tema for videre drøfting er kompetansebehov og kompetansefordeling. Bypakke Nord-Jæren omfatter et bredt spekter av aktiviteter, fra utbygging, planlegging, utredninger, porteføljestyling, økonomi og kommunikasjon osv.

Det er allerede igangsatt ulike samhandlingsgrupper som skal sikre effektive prosesser. Disse gruppene er spesielt rettet mot bedre samordning mellom areal og transport og effektive planprosesser på prosjektnivå.

God kommunikasjon både eksternt og internt er avgjørende for å sikre effektive prosesser i bypakken. En viktig forutsetning for god samhandling er felles forståelse av utfordringsbildet, behov for tiltak og forventede resultater.

7. Forslag til prioriteringer – Utbyggingsprosjekt 2017–2020

Basert på vedtatt forslag til Bypakke Nord-Jæren og prioriteringer i styringsgruppen, vil styringsgruppen i denne handlingsprogramperioden, prioritere utbygging av Sykkeltstamvegen og Bussveien korridor 1 og 2. Styringsgruppen vurderer prosjektene som sentrale tiltak for øke framkommelighet for syklister og kollektivreisende. Tiltakene vil sikre tilgjengelighet til viktige målpunkt på Nord-Jæren.

I tillegg prioriteres oppstart utbygging av riksvegdelene av Transportkorridor vest. Tiltaket inneholder bl.a. delstrekninger av Bussveien og tungbilfelt til Risavika havn. Tiltaket vil spesielt bedre framkommeligheten for syklende, kollektivreisende og næringslivets transporter.

Utbygging av E39 Hove–Ålgård foreslås startet opp mot slutten av perioden. Prosjektet er omtalt i dagens NTP 2014–2023.

Utbygging av 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren foreslås startet opp så snart som mulig etter at Stortinget har vedtatt Bypakke Nord-Jæren.

Utbyggingsplanen under forutsetter låneopptak i Bypakke Nord-Jæren. Det er pr. i dag usikkert når statlige bidrag vil kunne påregnes. Tabellen under viser tidligst mulige oppstart basert på optimal framdrift i prosjektene. En endelig finansieringsplan og behov for lån vil først kunne utarbeides etter at bymiljøavtale er inngått og ny NTP 2018 – 2029 er vedtatt.

Bygging 2017–2020	Mulig byggestart	Totalkostnad
Sykkeltstamvegen	2017	1220 mill.kr
Bussveien Korridor 1	Bygges nå	3160 mill.kr
Transportkorridor vest rv. 509	2018	3000 mill.kr
Bussveien Korridor 2	2018	2170 mill.kr*
E39 Hove – Ålgård	2019	3300 mill.kr
Bomstasjoner 38 stk.	2016	200 mill.kr

*Ekskludert del av Bussveien som inngår i Transportkorridor Vest

7.1 Bussveien

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet består av 22 reguleringsplaner, og er delt i fire korridorer/akser:

1. Korridor 1 fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum med sidearm til Forus.
2. Korridor 2 fra Stavanger sentrum til Risavika i Sola kommune med sidearm til Kvernevik ring. Deler av traseen, planlegges som en integrert del av Transportkorridor Vest.

3. Korridor 3 fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen (byggstart etter 2020)
4. Korridor 4 Forus – Sola fra Forus via Sola sentrum til Stavanger lufthavn Sola. (byggstart etter 2020)

Nummereringen av aksene angir også hvilken prioritert aksene har i planleggingen.

Busser som kjører i Bussveien skal ha full framkommelighet. Dette gir et høyverdig kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Traseene planlegges med gjennomgående tosidige løsninger for både syklende og gående.

Bussveien vil bli trafikkert av tre ulike busslinjer, hvor fylkestinget har lagt til grunn at Bussveilinje A og B vil bli elektrifisert ved bruk av kjøreledning og trolleybuss.

Som prosjekt er Bussveien i stadig utvikling. I løpet av høsten 2015 og våren 2016 så en for eksempel vesentlige endringer i forhold til konseptvalg på delstrekninger og teknologivalg for Bussveien. Slike endringer gir planmessige utfordringer.



7.1.1 Korridor 1

Akse nord-sør er i underkant av 20 kilometer lang, og går fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum med sidearm til Forus. Aksen planlegges og prosjekteres på en måte som muliggjør framtidig konvertering til bybane i tråd med vedtak i NTP 2014 – 2023. Fylkestinget har vedtatt at denne korridoren/fasen skal betjenes med trolleybuss.

Bussveien vil i aksen i hovedsak gå som midtstilt løsning. I Jåttåvågen vil Bussveien avvike fra fylkesvegen for å sikre et høyverdig kollektivtilbud i byutviklingsområdet som får over 2000 nye boliger og 10 000 nye arbeidsplasser. Mellom Kvadrat (Stokkaveien) og Sandnes sentrum har Sandnes kommune i kommuneplan for Sandnes valgt «Fjordalternativet». I løpet av 2. kvartal 2016 vil silingsrapport med anbefaling til endelig trasevalg og planprogram bli lagt fram for politisk behandling.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.1.2 Korridor 2

Akse øst-vest er i overkant av 22 kilometer lang, og går fra Stavanger sentrum til Risavika i Sola kommune med sidearm til Kvernevik ring. Fram til høsten 2015 ble den planlagt som sidestilt løsning på rv. 509 i Stavanger kommune. På grunn av nye momenter ble planleggingsarbeidet stanset, og det ble satt i gang et felles arbeid mellom Stavanger kommune, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune for å se på ulike alternativer for traseen. Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling i februar 2016, og anbefalingen om endring av konsept skal til politisk behandling i Stavanger kommune i løpet av mars 2016.

Aksen følger i hovedsak rv. 509, men vil over Jåsund og gjennom Tananger i Sola kommune følge fv. 375. Der Bussveien følger rv. 509 mellom Sundekrossen og Risavika, vil den inngå i Transportkorridor vest med tungbilfelt tillatt for buss og tunge kjøretøy. Fylkestinget har vedtatt at denne korridoren/fasen skal betjenes med trolleybuss.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.1.3 Korridor 3

Akse Sandnes øst er i underkant av 3 kilometer lang, og går fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen. Aksen planlegges og prosjekteres på en måte som muliggjør framtidig konvertering til bybane i tråd med vedtak i NTP 2014 – 2023. Fylkestinget har vedtatt at denne korridoren/fasen skal betjenes med trolleybuss. Sandnes kommune har i kommunedelplan for Skippergata vedtatt at Bussveien skal gå i Skippergata fv. 332.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.1.4 Korridor 4

Akse Forus – Sola er i overkant av 6 kilometer lang, og går fra Forus via Sola sentrum til Stavanger lufthavn Sola. Akse Forus – Sola skal ikke elektrifiseres ved bruk av kjøreledning

og trolleybuss. Det er startet opp planleggingen av aksene av Sola kommune og Rogaland fylkeskommune.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.2 Sykkelstamvegen

Det planlegges en sammenhengende høystandard sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura. Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklistene. Den skal ha høy standard og gi trygg, sikker og rask transport med mest mulig kort/direkte trasé.

Hovedmålet med Sykkelstamvegen er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord-Jæren fra personbil til sykkel, spesielt i forhold til arbeidsplassene i Forus/Lura-området.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.3 Transportkorridor Vest

Planarbeidene er delt i regulering av rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen mellom Sør-Tjora i Sola kommune og inngangen til Sunde i Stavanger kommune og fv. 409 fra Sundekrossen til Finnestad ved E39 i Randaberg kommune. Dagens veg på strekningen er en tofelts veg.

Vegen er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra Sømmevågen og flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og Dusavika. Det er mye kø på strekningen, både i morgen- og ettermiddagsrushet. Dette hindrer framkommelighet for både busser, næringstransport og andre kjørende. Det er bestemt at deler av strekningen på rv. 509 skal inneholde et pilotprosjekt for tungbilfelt, som skal bidra til å øke framkommeligheten for tyngre kjøretøy. Strekning for tungbilfeltet går fra Sømmevågen til fv. 375 Kvernevik Ring (sør). Tungbilfeltet vil her også bli benyttet av busser.

Strekningen Risavika havn – Sundekrossen – Kvernevik ring er en del av Bussveien.



Hovedmålet for prosjektet er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for kollektivtrafikk og næringstrafikk, bedre trafiksikkerheten og støyforholdene i nærmiljøet rundt lokale fasiliteter i området. I tillegg skal det legges til rette for god framkommelighet og trafiksikkerhet for gående og syklende langs strekningen.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.4 E39 Hove – Ålgård

E39 Ålgård–Hove består av ca. 14 km ny 4-felts motorveg fra Ålgård i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune.

Målet for utbyggingen er en trafiksikker hovedveg med god framkommelighet for alle trafikantergrupper.

Dagens veg har dårlig standard, stor trafikk, mange kryss, blandet trafikk og er et sårbart trafikksystem med lav framkommelig og høy ulykkesfrekvens. Trafikken gir stor belastning på nærmiljø.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

7.5 Bomstasjoner Bypakke Nord-Jæren

I forbindelse med gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren skal det etableres 38 nye bomstasjoner i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Bomringene skal plasseres som tette ringer rundt viktig reisemål på Nord Jæren der det er, eller skal bygges ut gode transportalternativ til privatbilen. I prosjektet skal også 22 eksisterende bomstasjoner rives.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

8. Forslag til prioriteringer – planleggingsprosjekt 2017–2020

Styringsgruppen ønsker holde framdrift i de planprosesser som pågår. I tillegg foreslås oppstart planlegging av tre større kollektivtiltak:

Planlegging 2017–2020	Planstatus
Bussveien Ruten – Vatnekrossen	Planlegging pågår
Bussveien Forus – Stavanger lufthavn Sola	Planlegging pågår
E39 Smiene – Harestad	Planlegging pågår
Fv. 330 Hoveveien Nord: Kollektivfelt	Planlegging pågår
Fv. 505 Foss–Eikeland – E39 Bråstein	Planlegging pågår
Kollektivtiltak Hillevåg– SUS – Tjensvoll – UiS– Diagonalen – Gauselvågen	Foreslås startet opp*
Kollektivfelt E39 Schancheholen – Solasplitten	Foreslås startet opp*
Rv 509 Solasplitten: Kollektiv–/ tungbilfelt	Foreslås startet opp*

*Planbehov og plannivå må vurderes nærmere utfra porteføljestygingsprinsippene

8.1 E39 Smiene – Harestad

E39 Smiene – Harestad omfatter en cirka 4,5 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune til Harestad i Randaberg kommune. Strekningen har en viktig funksjon som del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren.

Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler. Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkes utsatt og har et mangelfullt tilbud for gående og syklende. Prosjektet omfatter en utvidelse av E39 fra to til fire felt, og etablering av en miljøkulvert og planskilte kryss på strekningen.

Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god og trafikksikker kyststamveg med enhetlig



standard, som også sikrer lokal trafikk god fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper.

8.2 Fv. 330 Hoveveien: Kollektivfelt

Tiltaket skal legge til rette for å utvide dagens vei med tosidig kollektivfelt, tosidig sykkelfelt og tosidig fortau. Formålet med planen er å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, syklistene og fotgjengere, samt øke trafiksikkerheten på strekningen. Prosjektet går fra ny rundkjøring på Hove til og med kryss med Vågsgjerdveien i Sandnes sentrum. Lengden på prosjektet er på 1,8 km.

8.3 Fv. 505 Foss–Eikeland – E39 Bråstein

Tverrforbindelsen har som mål å gi en god forbindelse mellom E39 og tettsteder i Klepp, Time og sør i Sandnes, samt at den skal gi en særlig effektiv forbindelse mellom Ganddal godsterminal og målpunkt sørover langs E39. Vegprosjektet skal også sikre gode løsninger for gående og syklende i denne øst–vest–forbindelsen.

Ny vegforbindelse fra fv. 505 på Foss Eikeland til E39 på Bråstein, er andre og siste delstrekning av Tverrforbindelsen mellom rv. 44 og E39. Første delstrekning, mellom rv. 44 på Skjæveland og fv. 505 på Foss Eikeland, ferdigstilles noen år før andre delstrekning. Tverrforbindelsen mellom fv. 505 og E39 har en lengde på ca. 4 km.

Prosjektet vil i vest koble seg til første delstrekning ved fv. 505 i området Vagle/ Foss Eikeland. I øst skal prosjektet koble seg til nytt toplanskryss som kommer på Bråstein med vegprosjektet E39 Ålgård – Hove.

8.4 Kollektivtiltak Hillevåg– SUS – Tjensvoll – UiS–Diagonalen – Gauselvågen

Helsedepartementet la i januar 2016 fram at nytt Stavanger universitetssykehus (SUS) ønskes bygd på Ullandhaug. Reguleringsplan skal nå utarbeides, og første utbyggingstrinn skal stå klar i 2023. Det er viktig å få fram konsekvensene av ny lokalisering av SUS som blir et nytt viktig målpunkt på Nord–Jæren. Stavanger og Sola kommune jobber med en områdeplan for Ullandhaug der det tas høyde for nytt sykehus. Det er krav om egen detaljreguleringsplan for SUS. Det er igangsatt et arbeid med å vurdere de trafikale konsekvensene av ny lokalisering. Arbeidet må identifisere behov for infrastrukturtiltak. I tillegg er det igangsatt et arbeid for å se på konsekvenser for økt trafikal belastning i Granneskrysset på E39.

Oppstart av planarbeid på hele eller deler av strekningen Hillevåg– SUS – Tjensvoll – UiS– Diagonalen – Gauselvågen må vurderes i handlingsprogramperioden. Planbehov for hele eller deler av strekningen må kartlegges og prioriteres.

8.5 E39 Schancheholen – Solasplitten: kollektivfelt

Det skal etableres kollektivfelt på E39 Motorvegen mellom Schancheholen og Forus (Solasplitten) for å bedre framkommeligheten for busser og dermed øke attraktiviteten for busser som reisemiddelvalg på arbeidsreiser.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som har vurdert alternative løsninger for kollektivfelt. Rapporten gir en anbefaling om sidestilte kollektivfelt med omstigningsmulighet i Granneskrysset, for å sikre gode koblinger til kollektivtilbud som betjener bl.a. Diagonalen.

Rapporten er ferdigstilt, men ikke kvalitetssikret eksternt hos kommune og fylkeskommune.

Det forventes en avklaring om videre prosess (orienteringssak til KBU/Bystyret, oppstart av regulering) mot slutten av 1 kvartal 2016.

8.6 Rv. 509 Solasplitten: Kollektiv-/tungbilfelt

Solasplitten ble åpnet i 2012. Vegprosjektet ble bygget som tofeltsveg, men deler av strekningen ble tilrettelagt for utvidelse til fire felt for fase to. Nytt tiltak innebærer en utvidelse av Solasplitten med to ekstra felt reservert til bruk for tungbil- og kollektivtrafikk.

Tiltaket er delvis ferdig regulert i gjeldende reguleringsplan for Solasplitten. Imidlertid kreves ny regulering og stor ombygging av kryss ved Forus i øst. Nytt tunnelløp må også prosjekteres og bygges gjennom Åsnuten.

Målet med tiltaket er å tilrettelegge for bedre trafikkflyt og forutsigbarhet for gods- og kollektivtrafikk på en viktig gods- og kollektivtrasé mellom E39 på Forus og Sola lufthavn/ Risavika havn. Tiltaket skal ivareta hovedvegfunksjonen og gi bedre kapasitet for næringstransport og ekspressbussruter. Oppgraderingen ses i sammenheng med Transportkorridor Vest.

9. Forslag til prioriteringer – programområder

I tillegg til de store prosjektene i Bypakke Nord-Jæren, er det foreslått midler til programområdene sykkel, andre kollektiv tiltak, gange, trafiksikkerhet og miljøtiltak. Prioritering og tidlig realisering av mindre prosjekt innenfor programområdene anses som avgjørende for nå målene som er satt i bypakken.

Styringsgruppen etablerte allerede høsten 2015 faggruppene sykkel og gange, i tillegg ble det igangsatt et arbeid med å foreslå trafiksikkerhetstiltak i handlingsprogramperioden.

Faggruppene har prioritert å identifisere aktuelle mindre tiltak som skal gi måloppnåelse og som kan realiseres i 2017. Faggruppene vil i 2016 fokusere på å jobbe videre med kriterier for prioriteringer og analysearbeid som skal gi svar på hvilke strekninger og tiltak som skal prioriteres basert på prioriteringskriterier.

Under omtales prioritering av tiltak i 2017, samt forslag til viktige prioriteringer av aktiviteter i handlingsprogramperioden.

9.1 Sykkeltiltak

Arbeidet med å få på plass kriterier for hvordan sykkeltiltak skal prioriteres pågår. Dette arbeidet er ikke konkludert enda, men det er funnet en retning på hvordan prosjektene skal prioriteres. Det utarbeides en sykkelstrategi for Nord-Jæren parallelt med dette, hvor prioritering av tiltak også omtales. Kriteriene baseres på målene i Bypakken, som omhandler nullvekst i personbiltransport, økt fremkommelighet og vekst i sykkeltrafikken.

I handlingsprogramperioden foreslås foreløpig mindre tiltak i 2017 på dagens sykkelvegnett som skal gi økt fremkommelighet, trafiksikkerhet og komfort. De utvalgte strekningene har mange arbeidsreiser på sykkel, og her vil dagens sykkelløsning i stor grad bestå i en del år fremover. Målet har derfor vært å gjøre forbedringer innenfor den rammen.

Dagens situasjon og planlagte analyser i 2016, sammen med ferdige prioriteringskriterier, skal gi grunnlag for anbefalt prosjektprioritering til første rullering av handlingsprogrammet.

Figur 9.1.1: De 3 utvalgte strekningene for mindre utbedringstiltak på dagens hovedsykkelnett

Tiltak som foreslås i 2017 er:

- Utbedringstiltak langs de tre utvalgte strekningene.
- Bedre forholdene for syklende i sentrumsområdene, jfr. Regionalplan Jæren 2013–2040 sin definisjon av hoved- og kommunesenter.
- Forprosjekt som skal gi svar på om bruer kan vindskjermes for syklende.
- Bedre skilting og merking av dagens hovedsykkelnett.



Forslag tiltak i 2017

Kostnad

Sola – Tananger – Randaberg	700 000
Hundvåg	50 000
Møllebukta – Forus – Lura	2 200 000
Tiltak i sentrum	10 000 000
Skilting og merking av hovedruter	150 000
Forprosjekt vindskjerming av bruer	250 000
Uforutsett	1 000 000
SUM	14 350 000

Tabell 9.1.1: Prioritering programområde sykkel i 2017

Sentrum

Internasjonale erfaringer viser at potensialet for sykling er størst når avstanden mellom bosted og målpunkt er relativt kort (<5km). Derfor vil sentrumsområdene prioriteres høyt i forhold til å gjennomføre tiltak som har god måloppnåelse.

Det skal prioriteres å finne gode sykkelløsninger til, fra og gjennom sentrumsområdene på Nord-Jæren. Blant annet foreslås å prioritere syklist i gater med lite biltrafikk. Tiltak som dette er enkle og kan også være aktuelt i andre sentrumsgater i byområdet. Resultatet av arbeidene med sentrum skal bli konkrete tiltak og belyse behov for nye reguleringsplaner.

Satsingen på bedre tilrettelegging for sykkel som transportform langt på vei har begynt å materialisere seg i et godt plangrunnlag. Det foreligger vedtatte reguleringsplaner i flere av kommunene. I tillegg er flere større sykkeltiltak under regulering og prosjektering. Disse tiltakene vil prioriteres ved neste revisjon av handlingsprogrammet.

Sykkeltiltak ut over sekkeposten for programområde sykkel

I tillegg til tiltakene som inngår i programområde sykkel, blir det bygget andre prosjekt hvor gode sykkelløsninger er en del av prosjektet. Bussveien bygger 50 km av hovednettet for sykkel, som utgjør en femtedel av totalen. Transportkorridor Vest skal bygges med både høystandard sykkelfelt og sykkelveg med fortau langs hovednettet for sykkel. Ser vi sykkelsatsningen i lys av disse, i tillegg til Sykkelstamveien, vil hovednettet for sykkel få betydelig flere kilometer med hevet standard tidlig i handlingsprogramperioden.

9.2 Tiltak for gående

For å oppnå Bypakke Nord-Jæren sitt mål om nullvekst i personbiltrafikken må gange, sammen med sykkel og kollektiv, være en tidseffektiv, trygg og attraktiv transportform. Det foreslås å starte opp arbeid med å utvikle en gåstrategi der følgende tema tas opp:

- Kartlegging av infrastruktur for gående.
- Definere standard for ulike typer gangforbindelser.
- Prioritere etablering, utbygging og utbedring av gangforbindelser 2017–2032

Pr. i dag foreligger det ikke et grunnlag for prioriteringer for perioden 2017 – 2020. Til dette trengs et sett kriterier som må ses i sammenheng med måloppnåelse. Det foreligger heller ikke grunnlag for å velge prosjekter. Til dette trengs en kartlegging av status og behov. Målsetning er å konkludere et sett prioriteringskriterier i løpet av 2016.

I denne omgang foreslås det mindre tiltak til handlingsprogrammet som bygger på felles forståelse og vurdering av hvilke tiltak som viktige og mulige å bygge i 2017. Det er i tillegg foreslått noen tiltak for perioden 2018–2020. Prioriteringene rettes inn mot følgende områder:

- Hverdagsgåing.
- Senterområdene, holdeplassene og barneskolene.

1. Oppgradering av gangfelt, siktutbedring – barneskoler: 14.000.000 kroner

2. Tellepunkter – sentrum, friområder: 8.000.000 kroner

3. Gjennomføringsklart tiltak i Stavanger sentrum: 2.250.000 kroner

Andre aktuelle tiltak skal avklares i løpet av 2016.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

9.3 Kollektivtransport

I forhold til kollektivprosjekter som ikke er spesifisert i forslag til Bypakke Nord-Jæren, vil det være behov for et særskilt fokus på bybussnettverket i sentrale deler av Stavanger kommune og i noen grad i Sandnes kommune. Arbeidet med å kartlegge behov for andre viktige kollektivtiltak utover Bussveien, foreslås startet opp i 2016.

Finansiering av drift av kollektivtransport trenger en langsiktig avklaring. Økningen i rutetilbudet som allerede igangsettes fra sommer 2016 av må søkes finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommunen og midler fra enten belønningsordningen eller bompakken. Ved eventuell bruk av bompenger stilles det en rekke krav til dokumentasjon i saker hvor man legger opptil å bruke bompenger til drift av kollektivtransport.

Fra januar 2016 er det introdusert et nytt sone- og takstsystem for kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Nord-Jæren fungerer som en sone, buss, båt og tog inngår i et felles billettssystem og det tilbyr til dels svært gunstige billettpriser.

9.4 Trafikksikkerhet

I forslag til Bypakke Nord-Jæren er følgende føringer gitt for programområdet trafikksikkerhet:

«Programområde trafikksikkerhet skal bidra til å nå nasjonale målsetninger nedfelt i gjeldende nasjonale transportplaner. Innenfor programområde Trafikksikkerhet prioriteres gående og syklende. Tiltak for økt trafikksikkerhet prioriteres i henhold til kartlegging av ulykkessituasjonen, hvorvidt tiltaket kan bidra til økt trygghet for gående og syklende, videre ut fra tiltakets omfang og nytte. Tiltak for økt trafikksikkerhet som utløses av nye infrastrukturprosjekt inngår ikke i programområdet.»

9.4.1 Ulykkessituasjon

I perioden 2006-2015 har det skjedd 182 trafikkulykker med alvorlig konsekvens i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. I de 182 trafikkulykkene ble 31 drept og 164 alvorlig skadet.

Trafikkulykkene fordeler seg relativt likt på trafikantgrupper fotgjenger, sykkel, mc og bil. Omtrent 75 % av de alvorlige trafikkulykkene skjedde på riks- og fylkesvei.

9.4.2 Prioriteringer

Basert på en kartlegging av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekt på Nord-Jæren er det foretatt en vurdering av hvilke tiltak som foreslås prioritert i handlingsprogramperioden. Nyttige tiltak med lav kostnad vil bli prioritert tidlig i perioden. Tiltak som krever regulering eller prosjektering vil først prioriteres med midler til planlegging før det blir prioritert midler til bygging av tiltakene.

Totalt er det foreslått 18 tiltak. Totalkostnad på tiltakene er beregnet til 215,5 millioner. Det er i forslaget foreslått å bruke 7 millioner i 2017. Flere prosjekter trenger forprosjekt/prosjektering/regulering før de kan bygges. Det foreslås å starte prosjekteringsarbeidet i 2017 slik at en del av prosjektene kan bygges i 2018.

Se prosjektark vedlagt for flere opplysninger.

9.4.3 Tilfartskontroll og variable fartsgrenser E39

Tilfartskontroll og variable fartsgrenser foreslås som viktige trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene vil redusere risiko for ulykker som følge av påkjøring bakfra. I tillegg vil tiltakene medføre økt framkommelighet og forutsigbarhet på E39, samt bidra til overføring fra bil til miljøvennlige transportformer i storbyområdet.

Tilfartskontroll gir en høyere prioritering av trafikk som kommer fra områder utenfor sentrumsnære strøk, der kollektivtilbud og sykkelmulighetene normalt er dårligere enn nærere sentrum. Motsatt vil sentrumsnær trafikk bli prioritert lavere ved å sette opp tilfartskontroll. De med bedre sykkel- og kollektivtilbud får dermed noe lengre reisetid med bil på korte reiser. Tilfartskontroll er dermed med på å dreie konkurranseforholdet til fordel for miljøvennlige transportformer i sentrumsnære strøk, noe som er i tråd med de målsettingene for bypakken.

9.5 Miljø – støy og luftforurensing

Det må startes opp et arbeid for å kartlegge behov for tiltak som kan bedre bymiljøet med tanke på støy og luftforurensing. Mål om nullvekst vil i seg selv gi god effekt og vil gi et bedre bymiljø. Det er likevel behov for å se nærmere på andre tiltak som vil bedre støyforhold og luftkvalitet i byområdet.

10. Øvrige innsatsområder

10.1 Kommunikasjon

Bypakke Nord-Jæren har en viktig oppgave å informere om arbeidet som pågår. Innbyggerne i de fire kommunene på Nord-Jæren er en viktig målgruppe, for at de skal vite hva bypakken er, hvilke prosjekter de får i bypakken, og hva det betyr for de i hverdagen. Nettsiden er første skritt for å informere. Andre viktige mål for 2016 er å lage en fellespresentasjon som alle parter kan bruke og lage en film om bypakken.

Det er behov for å samarbeide med andre parter som jobber for å oppnå de samme målene som Bypakke Nord-Jæren; nullvekst og framkommelighet spesielt for kollektiv, sykkel, gange og næring. Et samarbeid med mobilitetsgruppen i Rogaland fylkeskommune, Sykkelløftet, Hjem-jobb-hjem (Kolumbus), og andre relevante parter er viktig å få etablert i 2016 og videre i handlingsprogramperioden.

Bypakke Nord-Jæren ønsker å kommunisere godt med omverden. Arbeidsoppgaver og innsatsområder endrer seg i takt med behov og ønsker fra styringsgruppen.

10.2 Mobilitetsarbeid

Mobilitetsarbeidet på Nord-Jæren er fra januar 2016 av organisert som et Mobilitetsprosjekt der flere aktører (kommunene, fylkeskommune, Kolumbus, Statens vegvesen med flere) jobber mot samme mål i arbeidet med grønn mobilitet. Ved å samordne tiltakene og

kommunisere budskapet mer samlet vil effekten av tiltakene og ressursbruken bli sterkere. Det er i tillegg behov for å finne de gode «verktøyene» for mobilitetspåvirkning i vår region.

Med utgangspunkt i Belønningsordningen for bedre transport i byområdene utvikles det et opplegg og en organisering av arbeidet med mobilitetspåvirkning. Det fokuseres i første omgang på arbeidsreiser. Kolumbus og Bysykkelen har forut for etableringen av Mobilitetsprosjektet utviklet et konsept rettet mot bedrifter og arbeidsreiser. Konseptet hadde fått merkenavnet Hjem/Jobb/Hjem. De foreløpige erfaringene med konseptet var gode og det var naturlig å bygge videre på dette arbeidet og ha fokus på arbeidsreiser i første omgang. Alle tiltak rettet mot arbeidsreiser som gjennomføres som en del av prosjektet vil bli koblet opp mot merkenavnet Hjem/Jobb/Hjem.

På et senere tidspunkt kan det være aktuelt å se på andre typer reiser. Erfaringene, ideene samt materiell som utvikles gjennom dette arbeidet, skal i så stor grad som mulig stilles til disposisjon for andre som vil arbeide med grønn mobilitet. Slik kan resultatene av arbeidet komme til anvendelse i andre deler av fylket og eventuelt i landet forøvrig.

Gjennomføring av tiltak og ordninger som utvikles og finansieres med belønningsmidler gjelder kun i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltak som har effekt på transportmønsteret inn og ut av de aktuelle kommunene vil imidlertid også kunne være aktuelle.

Styringsgruppen i mobilitetsprosjektet skal arbeide for å fremme «grønn» mobilitet gjennom mobilitetspåvirkning ved å:

1. Etablere og videreutvikle et hensiktsmessig nettverk og en organisering av arbeidet med mobilitetstiltak.
2. Utarbeide samt løpende videreutvikle og kommunisere gode verktøy og løsninger for mobilitetspåvirkning.
3. Drive frem mobilitetsprosjekt som skal være eksempler og case for de gode løsningene knyttet til mobilitetspåvirkning.

10.3 Drift sekretariat Bypakke Nord-Jæren

Behov for utvidelse av sekretariatet må vurderes nærmere. Som omtalt i kapittel 6.4, er det behov for en gjennomgang av kapasitet- og kompetansebehov totalt sett mellom partene. Hva som skal ligge til de ulike administrasjonene og hva som inngår i sekretariatets oppgaveportefølje må vurderes nærmere. Årlige budsjett behandles i styringsgruppen.

11. Forventet måloppnåelse av handlingsprogram 2017–2020

I dette kapitlet gis det en vurdering av hvordan større prosjekt, rammer til investeringer i veg og kollektivtrafikk og midler til styrket kollektivtilbud er forventet å bidra til å oppnå vedtatte mål for Bypakke Nord-Jæren i handlingsprogramperioden. Det vises også til omtalen av de enkelte tiltakene i kapittel 7 og i prosjektark.

I forslag til Bypakke Nord-Jæren er det lagt opp til en miljøvennlig profil ved at 70 % av investeringene går til kollektiv, sykkel og gange og 30 % går til vegtiltak. Styringsgruppen har videre prioritert Sykkelstamvegen, Bussveien og Transportkorridor vest som de viktigste prosjektene å få realisert.

11.1 Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren

I Handlingsprogram 2017–2020 er det mål om å ta veksten i persontransport med kollektivtransport, sykling og gåing. I beregningene av inntektene fra bomringen er det forutsatt nullvekst i antall passeringer med personbil i årene fremover. Prioritering av tiltak for kollektivtrafikk, gåing og sykling i Handlingsprogram 2017–20 gir grunnlag for å klare å nå dette målet fremover.

Arbeidet med å fullføre hovednett for sykkel og gåing på Nord-Jæren vil være et viktig satsingsområde i denne handlingsprogramperioden. Dette er tiltak som forventes å bidra til økte gang- og sykkelandeler. I tillegg legges det vekt på å få til gode løsninger som gjør det mer attraktivt å gå og sykle som en del av alle store veg- og kollektivprosjekter. En viktig oppgave for Bypakke Nord-Jæren er å få oversikt over målkonflikter. Det må bl.a. sees videre på utrede mulige konsekvenser av vegprosjekter som øker kapasiteten for personbilene i byområdene, og samtidig vurdere om nye utbyggingsområder/viktige målpunkt på Nord-Jæren vil bygge opp under nullvekstmålet. Det kan vise seg å være behov for mottiltak for å nå nullvekstmålet, som f.eks. prising, differensiering og restriksjoner.

I tillegg arbeider Nord-Jæren målbevisst med andre virkemidler innen arealplanlegging og parkeringspolitikk som bidrar positivt til denne målsetningen – ikke minst gjennom arbeid som pågår på regionalt nivå (Regionalplan Jæren). Rogaland fylkeskommune skal vurdere revisjon av Regionalplan Jæren i løpet av 2016. Det er igangsatt et samarbeid mellom partene med fokus på bedre samordning av areal og transport og grunnlag for bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Nord-Jæren.

Andre forhold som vil påvirke måloppnåelsen er parkeringspolitikk, mobilitetsplanlegging og økonomisk- og teknologisk utvikling. Innholdet i nye avtaler om belønningsmidler,

bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler vil innvirke på måloppnåelsen og regionen har her en viktig oppgave foran seg.

11.2 God framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport

Tiltakene som prioriteres i handlingsprogrammet er ventet å bidra til bedre framkommelighet for prioriterte trafikantgrupper. Det settes av midler til framkommelighetstiltak for buss og sykkel. Bussveien bidrar til bedre punktlighet og færre strekninger med redusert hastighet. Framkommeligheten for gående, syklende og næringstrafikk bedres spesielt der det gjøres tiltak. I handlingsprogramperioden gjelder dette spesielt Sykkeltamvegen, Bussveien og Transportkorridor Vest. E39 Hove – Ålgård vil bidra til bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper.

I tillegg til de store prosjektene er det avgjørende å få realisert viktige tiltak på de ulike programområde tiltakene for å sikre måloppnåelse.

Bypakke
Nord-Jæren
Handlingsprogram
2017–2020

Sykkelstamvegen

Tiltakshaver: Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak: Det planlegges en sammenhengende høystandard sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura. Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklistene. Den skal ha høy standard og gi trygg, sikker og rask transport med mest mulig kort/direkte trasé.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Delstrekningen fra Sørmarka i Stavanger til Smeaheia i Sandnes som er ferdig regulert og gjennomgår ekstern kvalitetssikring KS2. Prosjektering er startet opp.

Delstrekningen fra Stavanger til Schankeholen er under bygging i regi av Ryfastprosjektet.

Delstrekningen fra Schankeholen til Sørmarka er under regulering. Forventet vedtak 1. kvartal 2016

For delstrekningen fra Smeaheia til Sandnes er under regulering. Forventet vedtak 1. kvartal 2017.

Kostnadsoverslag: 1220 mill. kr

Mulig utbyggingsperiode:

Prosjektet bygges ut i deletapper i perioden 2017–2020



Bussveien Korridor 1

Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet består av 22 reguleringsplaner, og er delt i fire korridorer/akser. Korridor 1 går fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, med en sidearm til Forus, i hovedsak på fv. 44.

Busser som kjører i Bussveien skal ha full framkommelighet. Dette gir et høyverdig kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Traseene planlegges med gjennomgående tosidige løsninger for både syklende og gående.



Kostnadsoverslag

Total kostnad for de gjenværende prosjekter på Bussveien er i overkant av 9 000 millioner kroner. Korridor 1 har en anslått kostnad på 3 160 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode

Det er påbegynt utbygging på korridor 1, og byggeperioden vil avsluttes i løpet av 2021.

Bussveien Korridor 2

Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet består av 22 reguleringsplaner, og er delt i fire korridorer/akser. Korridor 2 går fra Stavanger sentrum til Risavika, med sidearm til Kvernevik ring, i hovedsak på rv. 509.

Busser som kjører i Bussveien skal ha full framkommelighet. Dette gir et høyverdig kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Traseene planlegges i hovedsak med gjennomgående tosidige løsninger for både syklende og gående.

Kostnadsoverslag

Total kostnad for de gjenværende prosjekter på Bussveien er i overkant av 9 000 millioner kroner. Korridor 2 har en anslått kostnad på 2 170 millioner kroner eksklusive TKV-kostnader på kr 2 350 millioner kroner, totalt 4 520 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode

2018 – 2023



Bussveien Korridor 3

Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet består av 22 reguleringsplaner, og er delt i fire korridorer/akser. Korridor 3 går fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen, i hovedsak på fv. 332.

Busser som kjører i Bussveien skal ha full framkommelighet. Dette gir et høyverdig kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Traseene planlegges med gjennomgående tosidige løsninger for både syklende og gående.



Kostnadsoverslag

Total kostnad for de gjenværende prosjekter på Bussveien er i overkant av 9 000 millioner kroner. Korridor 3 har en anslått kostnad på 540 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode

2021 – 2023

Bussveien Korridor 4

Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak

Bussveien er prosjektnavnet på et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren. Prosjektet består av 22 reguleringsplaner, og er delt i fire korridorer/akser. Korridor 4 går fra Forus vest via Sola sentrum til Stavanger lufthavn Sola.

Busser som kjører i Bussveien skal ha full framkommelighet. Dette gir et høyverdig kollektivtilbud med sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy kapasitet og gir forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Traseene planlegges med gjennomgående tosidige løsninger for både syklende og gående.



Kostnadsoverslag

Total kostnad for de gjenværende prosjekter på Bussveien er i overkant av 9 000 millioner kroner. Korridor 4 har en anslått kostnad på 630 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode

Etter 2020

Transportkorridor Vest

Tiltakshaver: Statens vegvesen, prosjektavdelingen Region vest

Beskrivelse av tiltak: Planarbeidene er delt i regulering av rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen mellom Sør-Tjora i Sola kommune og inngangen til Sunde i Stavanger kommune og fv. 409 fra Sundekrossen til Finnestad ved E39 i Randaberg kommune.

Vegen er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra Sømmevågen og flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og Dusavika. Innenfor planens influensområde er Risavika havn lokalisert, flere større boligfelt, både eksisterende og planlagte i begge kommunene, en rekke skoler, sosial infrastruktur mv.

Det er bestemt at deler av strekningen på rv. 509 skal inneholde et pilotprosjekt for tungbilfelt, som skal bidra til å øke framkommeligheten for tyngre kjøretøy. Strekning for tungbilfeltet går fra Sømmevågen til fv. 375 Kvernevik Ring (sør). Tungbilfeltet vil her også bli benyttet av busser.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Riksvegdel (Sør Tjora– Kvervevik ring sør)

Reguleringsplan for riksvegdelene antas vedtatt i Sola medio mars og Stavanger primo april. Prosjektering av Hafrsfjord bru pågår.

Fylkesvegdel (Sundekrossen–Finnestad)

Reguleringsplan for fylkesvegen skal fullføre forprosjekt våren 2016. Det antas at reguleringsplan vedtas 1–2 kvartal 2017.

Kostnadsoverslag: Riksvegdel 2880 mill.kr (+/-10%), fylkesvegdel anslått 1000 mill.kr (+/- 40%).

Mulig utbyggingsperiode:

Riksvegdel 2018–2021 og fylkesvegdel etter 2020



E39 Hove – Ålgård

Tiltakshaver: Statens vegvesen, prosjektavdelingen Region vest

Beskrivelse av tiltak:

E39 Ålgård–Hove består av ca. 14 km ny 4-felts motorveg fra Ålgård i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune. E39 er en del av det overordnede nasjonale riksvegnettet som knytter sammen landsdeler og regioner. I Rogaland er E39 også en del av Kyststamvegen som knytter Vestlandet sammen. Mellom Ålgård og Hove har E39 også en viktig lokal funksjon i å knytte tettstedene Ålgård og Figgjo sammen med Sandnes, Stavanger og resten av Nord Jæren til et felles arbeids- og boligmarked. Vegen betjener også fritids- og helgetrafikk til Sirdalsfjellene og turistrattikk til Kongeparken om sommeren. Mangelfullt lokalt vegnett gjør at E39 også fungerer også som intern lokalveg i Figgjo og Ålgård.



Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Reguleringsplanlegging pågår. Forventet planvedtak 1. kvartal 2018

Kostnadsoverslag: 2,5 – 3.300 mill. kr.

Samfunnsøkonomi:

Prosjektet er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. $NN/K=0,26$

Mulig utbyggingsperiode:

2019–2023

Bomstasjoner Bypakke Nord-Jæren

Tiltakshaver: Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak: I forbindelse med gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren skal det etableres 38 nye bomstasjoner i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Bomringene skal plasseres som tette ringer rundt viktig reisemål på Nord Jæren der det er, eller skal bygges ut gode transportalternativ til privatbilen. I prosjektet skal også 22 eksisterende bomstasjoner rives.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

To bomstasjoner har vedtatte reguleringsplaner, mens de andre to er påklagd og avventer klagebehandling.

Ytterligere 2 bomstasjoner har gjennomgått behandling for mindre reguleringsendring i forhold til gjeldene plan.

I arbeidet med stengning av veger som vil være lekkasjepunkter i bomringene pågår.


Bomstasjonene må behandles etter plan- og bygningsloven med byggesaksbehandling i de tre kommunene. Bomstasjonene i Sola kommune er ferdigbehandlet mens arbeidet i Sandnes og Stavanger pågår.

Alle bomstasjonene er ferdig prosjektert og det foreligger ferdig tegninger for hver stasjon. Arbeid med mengdebeskrivelse og øvrige kontraktsdokumenter pågår. Anbudet for vegkantutstyr er under utarbeidelse. Grunnervvervsforhandlinger pågår for fullt.

Kostnadsoverslag: 200 mill

Mulig utbyggingsperiode:

Anbudet for bygging vil være klart for utlysning når saken legges frem for Stortinget. Anskaffelsesprosessen er beregnet til 3 måneder fra utlysningstidspunkt. En oppstart kan være aktuelt oktober/november 2016 og byggetid på prosjektet vil være 1 år.

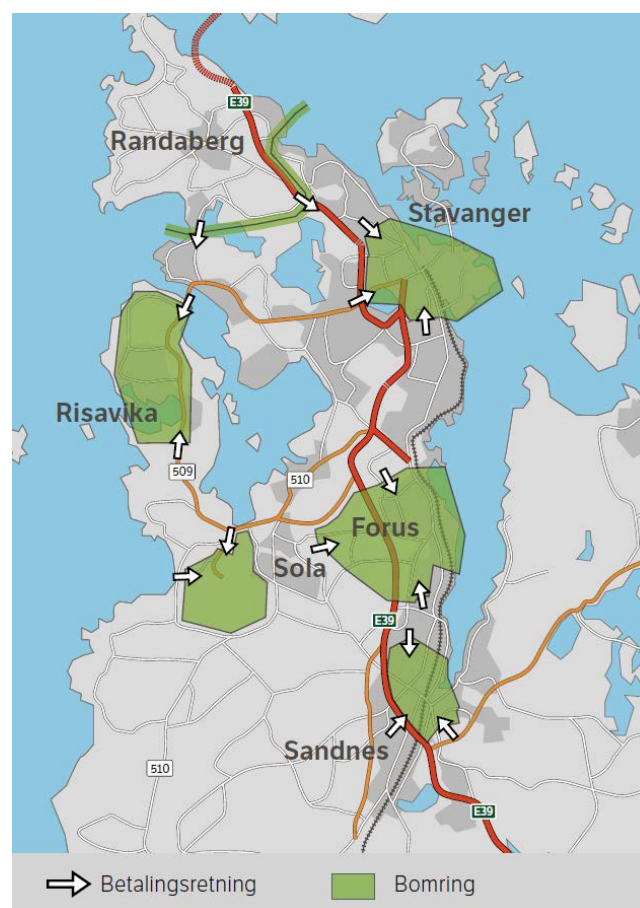

E39 Smiene – Harestad

Tiltakshaver: Statens vegvesen, prosjektavdelingen Region vest

Beskrivelse av tiltak:

E39 Smiene – Harestad omfatter en cirka 4,5 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune til Harestad i Randaberg kommune. Strekningen har en viktig funksjon som del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene–Harestad er et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast-forbindelsen i nord. Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler. Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt tilbud for gående og syklende. Prosjektet omfatter en utvidelse av E39 fra to til fire felt, og etablering av en miljøkulvert og planskilte kryss på strekningen.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Reguleringsplanarbeidet med E39 Smiene – Harestad har vært delt i to. Reguleringsplan for Harestadkrysset er vedtatt. Reguleringsplanlegging for strekningen Smiene – Harestad pågår. Forventet planvedtak 2. kvartal 2017.

Kostnadsoverslag: Harestadkrysset 676 mill. kr. (+/-10%). E39 Smiene – Harestad: kostnader foreligger i april 2016.

Mulig utbyggingsperiode:

2021–2024




Fv. 330 Hoveveien

Tiltakshaver: Sandnes kommune/Rogaland Fylkeskommune/Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak:

Tiltaket skal legge til rette for å utvide dagens vei med tosidig kollektivfelt, tosidig sykkelfelt og tosidig fortau. Formålet med planen er å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, syklist og fotgjengere, samt øke trafikksikkerheten på strekningen. Prosjektet går fra ny rundkjøring på Hove til og med kryss med Vågsgjerdveien i Sandnes sentrum. Lengden på prosjektet er på 1,8 km.

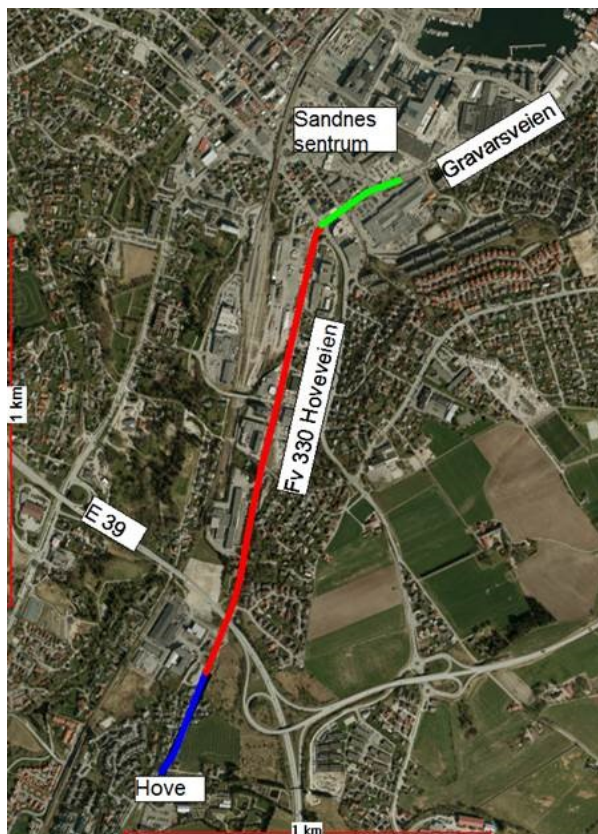

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Det foreligger godkjent reguleringsplan på 300 meter av den sørligste delen (blå del). Fra Kvelluren til Høylandsgata (rød del) har reguleringsplanen vært ute på høring men planarbeidet har stoppet litt opp. Dette for å få nødvendige avklaringer knyttet til pågående reguleringsplanarbeid for bussveien i Gravarsveien/Julie Eges gate. Det er nå avklart at den sørligste delen av Gravarsveien (l=ca. 230 meter, grønn del) skal inngå i reguleringsplanen for Hoveveien. Før planen viderebehandles skal det gjøres en utredning av sidestilt vs. midtstilt løsning da dette ble bestilt av utvalg for byutvikling ved 1. gangs behandlingen samt et forprosjekt knyttet til forlengelsen av planen i Gravarsveien nord for Høylandsgata.

Kostnadsoverslag: 290 mill.kr

Mulig utbyggingsperiode:

Etter 2021

Fv. 505

Foss Eikeland – E39 Bråstein


Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak

Tverrforbindelsen har som mål å gi en god forbindelse mellom E39 og tettsteder i Klepp, Time og sør i Sandnes, samt at den skal gi en særlig effektiv forbindelse mellom Ganddal godsterminal og målpunkt sørover langs E39. Vegprosjektet skal også sikre gode løsninger for gående og syklende i denne øst-vest-forbindelsen.

Ny vegforbindelse fra fv. 505 på Foss Eikeland til E39 på Bråstein, er andre og siste delstrekning av Tverrforbindelsen mellom rv. 44 og E39. Første delstrekning, mellom rv. 44 på Skjæveland og fv. 505 på Foss Eikeland, ferdigstilles noen år før andre delstrekning. Tverrforbindelsen mellom fv. 505 og E39 har en lengde på ca 4 km.

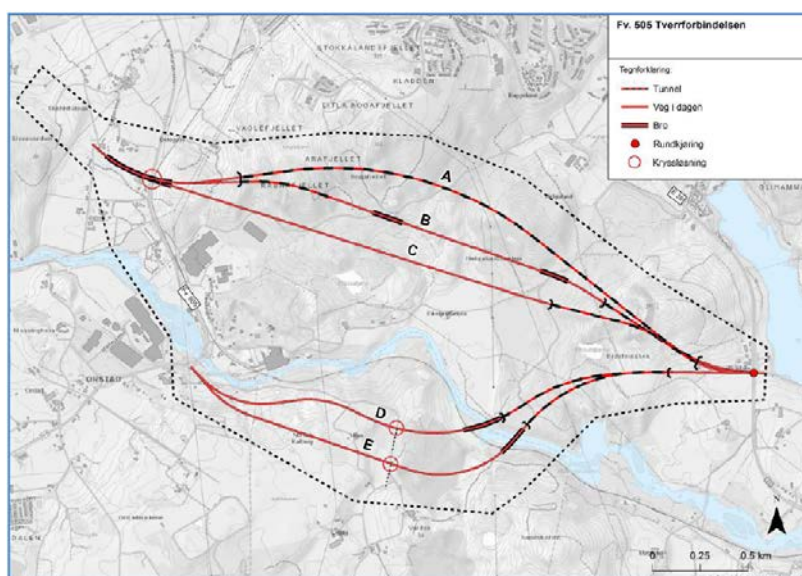

Prosjektstatus/Planlagt framdrift: Arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning pågår. Planvedtak medio 2017. Reguleringsplanarbeid anslått oppstart medio 2017 med forventet planvedtak medio 2019.

Kostnadsoverslag: Anslag vil først foreligge ultimo 2016. Inntil videre blir det tatt utgangspunkt i kostnad i saksframlegg for Bypakke Nord Jæren, dvs 700 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode: Etter 2020

Hillevåg–Tjensvoll–Uis– Diagonalen–Gauselvågen

Tiltakshaver:

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak:

Tiltaket innebærer etablering av en til dels ny trasé for busstrafikken til Ullandhaugområde. Både i Hillevåg og mot Jåttåvågen kobles traséen mot Bussveien–traséen i Fv44. Traséen gir også overgang mellom tog og buss ved Paradis og Jåttåvågen stasjon.

Tiltaket innebærer utvidelse av Hillevågstunnelen og etablering av ny kulvert for busstrafikken på Tjensvoll. For øvrig vil bussen følge mindre, kommunale gater gjennom Tjensvollområdet. Gjennom universitetsområdet og fremtidig sykehusområde på Ullandhaug, vil bussen følge egen trasé, mens Diagonalen vil utvides med egne kollektivfelt.



Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Det er ikke påbegynt formell planlegging av prosjektet. Prosjektet, inklusive skisser på traséføring, er definert gjennom KVVU-arbeidet. Endelig traséføring, samt alle konkrete løsninger når det gjelder kryss og plassering av kollektivfelt i tverrsnittet, vil måtte avklares gjennom reguleringsplanarbeid.

Kostnadsoverslag:

Gjennom KVVU-arbeidet ble det gjennomført kostnadsoverslag for prosjektet, og oppjustert til 2015-kroner er dette overslaget på 680 millioner kroner.

Mulig utbyggingsperiode:

Kollektivfelt

E39 Schancheholen – Solasplitten

Tiltakshaver

Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak


Det skal etableres kollektivfelt på E39 Motorvegen mellom Schancheholen og Forus (Solasplitten) for å bedre framkommeligheten for busser og dermed øke attraktiviteten for busser som reisemiddelvalg på arbeidsreiser.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som har vurdert alternative løsninger for kollektivfelt. Rapporten gir en anbefaling om sidestilte kollektivfelt med omstigningsmulighet i Granneskrysset, for å sikre gode koblinger til kollektivtilbud som betjener bl.a Diagonalen. Rapporten er ferdigstilt, men ikke kvalitetssikret eksternt hos kommune og fylkeskommune. Det tas sikte på igangsetting av reguleringsarbeid 3 kv 2016.

Kostnadsoverslag: Grovt anslag i forslag til Bypakke Nord-Jæren, 460 mill kr.

Mulig utbyggingsperiode: Etter 2020

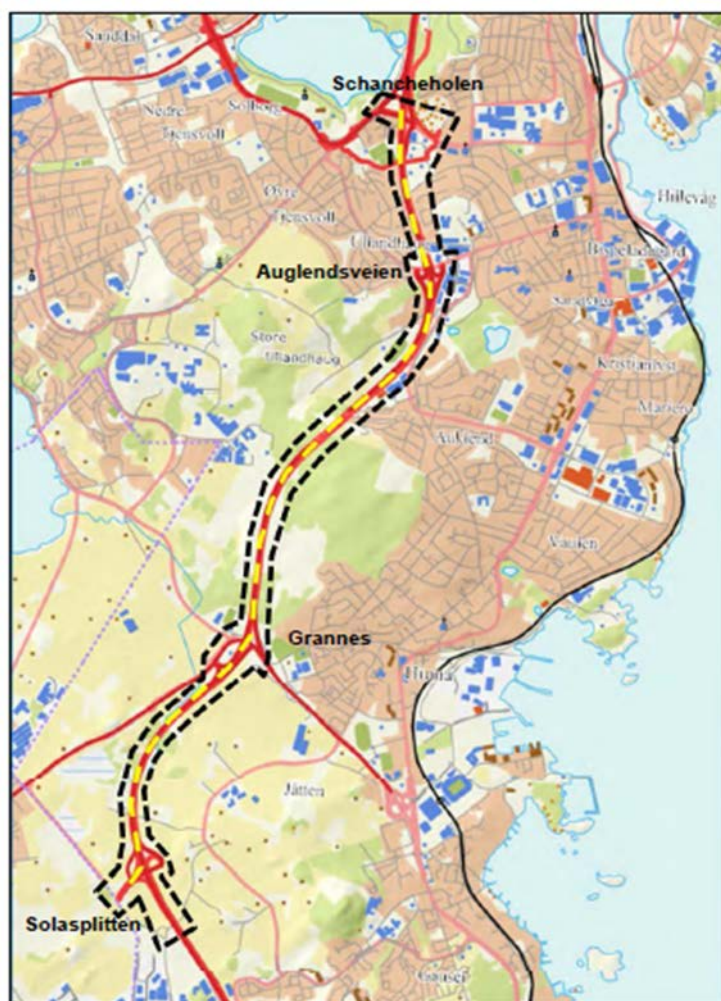

Rv 509 Solasplitten

Kollektiv- / tungbilfelt


Tiltakshaver: Statens vegvesen

Beskrivelse av tiltak:

Nytt tiltak innebærer en utvidelse av Solasplitten med to ekstra felt reservert til bruk for tungbil- og kollektivtrafikk.

Tiltaket innbefatter en bygging av kollektiv- / tungbilfelt over en strekning på ca 3800 meter, inkludert et nytt tunnelløp på ca 300 meter gjennom Åsnuten. Miljøkulverten ved

Kristenberget er bygget for fire felt, og store deler av strekningen er regulert for fire felt. Problematikk mht støy og miljø er i stor grad ivarettatt i første fase av prosjektet. Imidlertid kreves en ny regulering og stor ombygging av kryss ved E39 og tilknytning til Forus øst.

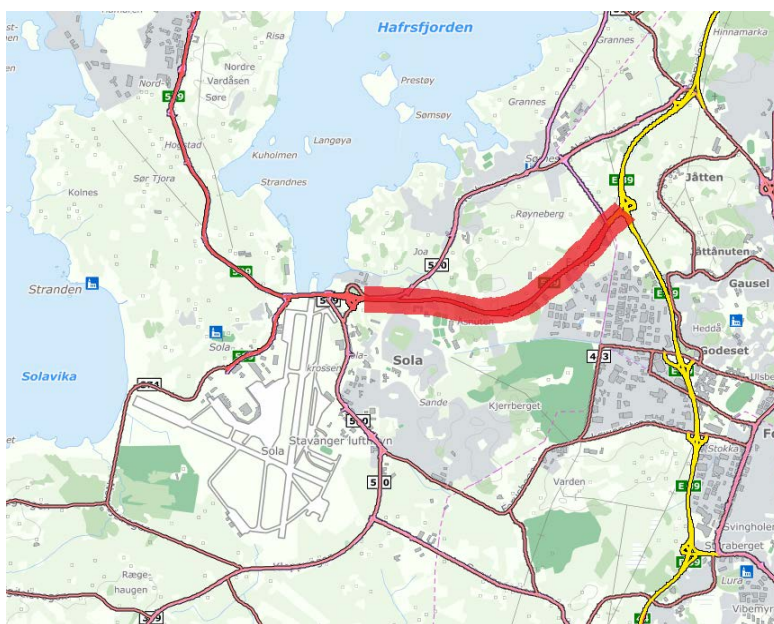

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for fire felt på Solasplitten. Tiltaket er delvis ferdig regulert i gjeldende reguleringsplan for Solasplitten. Imidlertid kreves ny regulering og stor ombygging av kryss ved Forus i øst. Nytt tunnelløp må også prosjekteres og bygges gjennom Åsnuten. For nye kryssløsninger opp mot E39 er det behov for avklaring gjennom ny reguleringsplan. Forprosjekt knyttet til planomfang og omregulering bør utarbeides før en går i gang med ny reguleringsplan. Prosjektet må fremdriftsmessig ses i sammenheng med utbygging av kollektiv- / tungbilfelt mellom Sømmevågen og Risavika havn. Samtidig må tilknytningen til Forus øst og E39 vurderes på nytt, og ses i sammenheng med planer for kollektivfelt langs E39 på stekningen Schankeholen – Solasplitten.

Kostnadsoverslag: 700 mill.kr

Mulig utbyggingsperiode:

Etter 2020

Sykkel – Programområde

Tiltakshaver: Statens vegvesen/kommunene

Beskrivelse av tiltak:

Det er identifisert behov for en rekke mindre tiltak på dagens sykkelvegnett som skal gi økt fremkommelighet, trafiksikkerhet og komfort. Det er i dette arbeidet valgt ut noen strekninger hvor dagens sykkelløsning i stor grad vil bestå i en del år fremover.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Tiltakene foreslått i 2017 krever ikke reguleringsplan. Det foreligger en del ferdig regulerte sykkeltiltak, men de skal vurderes nærmere i forhold til måloppnåelse og vil bli gjenstand for prioritering ved neste revisjon av handlingsprogrammet.

Kostnadsoverslag:

Hvor	Kostnad
Sola – Tananger – Randaberg	685 000
Hundvåg	52 000
Møllebukta – Forus – Lura	2 186 000
Tiltak i sentrum	10 000 000
Skilting og merking av hovedruter	125 000
Forprosjekt vindskjerming av bruer	250 000
Uforutsett	1 127 000
Sum sykkeltiltak 2017	14 425 000

Mulig utbyggingsperiode:

2017–2020

Gåing – Programområde

Tiltakshaver: Statens vegvesen/kommunene

Beskrivelse av tiltak:

Tiltak for gående rettet inn mot:

- Hverdagsgåing.
- Senterområdene, holdeplassene og barneskolene.
- Oppgradering av gangfelt, siktutbedring, møblering og tellepunkter.

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Tellepunkter – sentrum, friområder: 8.000.000 kroner

I hver kommune etableres ett tellepunkt med display i hovedsenter, og ett i friområde i nærmiljø. I 2017 foreslås det å sette opp 4 tellepunkter, i alle kommunesentra.

Grove kostnadsoverslag for tellepunkter med display basert på hva det koster å anlegge tellepunkt for sykkel. Teknisk utstyr, gravearbeid, tilkobling til strøm og display kommer på ca. 1 000 000 kroner inklusiv moms per stykk.

2. Oppgradering av gangfelt, siktutbedring – barneskoler: 14.000.000 kroner

Tiltakene gjennomføres langs skoleveger til barneskoler og ungdomsskoler.

I løpet av 2016 samles det inn data om allerede identifiserte behov og om allerede foreslåtte tiltak. Disse skal sammenstilles og eventuelle mangler korrigeres. Det foreslås å sette av 3,5 millioner kroner per år. 1 million kroner brukes til utredning og prosjektering av tiltak, og 2,5 millioner kroner på fysiske tiltak.

3. Gjennomføringsklart tiltak i Stavanger sentrum: 2.250.000 kroner

Et snarvegprosjekt mellom Muségata og Lagårdsveien, knyttet til holdeplassen ved bussveien, er ferdig regulert og det er gjennomført grunnnerv. Prosjektering og gjennomføring er beregnet til 2,25 millioner kroner.

Kostnadsoverslag:

9,75 mill. kr i 2017, foreløpig kostnader for 2018–2020 er 14,5 mill.kr

Mulig utbyggingsperiode:

2017–2020

Trafikksikkerhet – Programområde

Tiltakshaver: Statens vegvesen/kommunene


Beskrivelse av tiltak:

Det er foreslått 18 tiltak basert på kriterier fastsatt i forslag til Bypakke Nord-Jæren:

«Programområde trafikksikkerhet skal bidra til å nå nasjonale målsetninger nedfelt i gjeldende nasjonale transportplaner. Innenfor programområde Trafikksikkerhet prioriteres gående og syklende. Tiltak for økt trafikksikkerhet prioriteres i henhold til kartlegging av ulykkessituasjonen, hvorvidt tiltaket kan bidra til økt trygghet for gående og syklende, videre ut fra tiltakets omfang og nytte. Tiltak for økt trafikksikkerhet som utløses av nye infrastrukturprosjekt inngår ikke i programområdet.»

Prosjektstatus/Planlagt framdrift:

Tiltakene foreslått i 2017 krever ikke reguleringsplan. Det foreligger en del ferdig regulerede trafikksikkerhetstiltak, men de skal vurderes nærmere i forhold til måloppnåelse og vil bli gjenstand for prioritering ved neste revisjon av handlingsprogrammet.

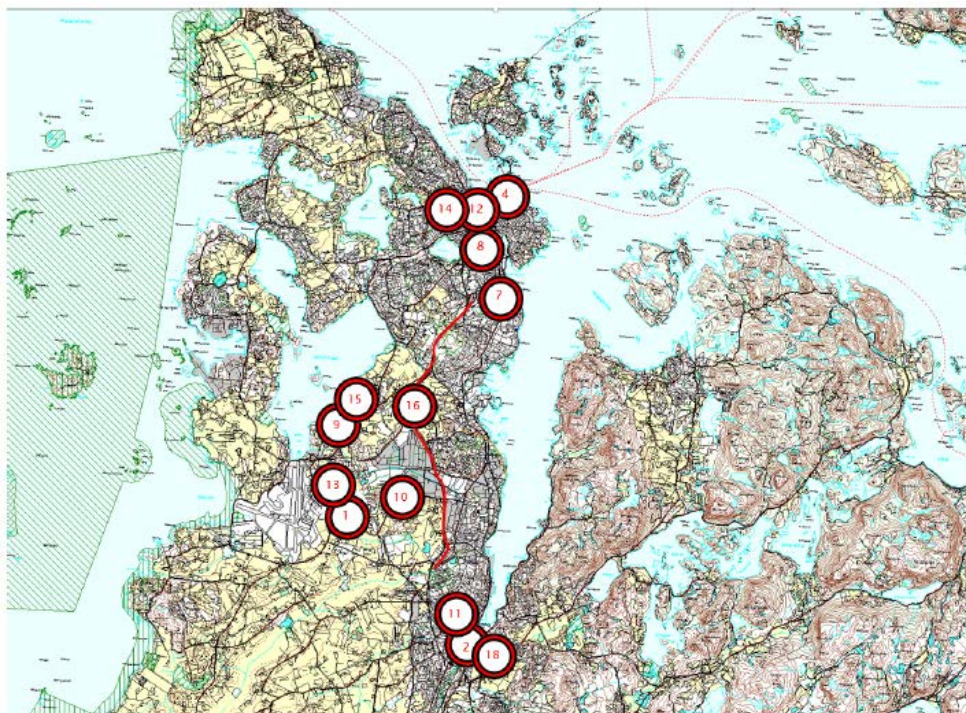

VEDLEGG 5

Kostnadsoverslag:

Trafikksikkerhet – Forslag til handlingsprogram 2017–2031. Millioner kroner inklusiv moms.							
Sak.nr.	Trafikksikkerhetstiltak	2017	2018	2019	2020	2021–2031	Sum
1	Trafikkanalyse Sola kommune	0,1					0,1
2	Elveplassen Sandnes kommune, Trafikksikkerhetstiltak	0,3	1				1,3
3	Trafikksikkerhet ungdomsskoleveg.	0,5	2,5	2	2	4	11
4	Utbedring av ulykkespunkt og ulykkesstrekning.	0,5	2	2	2	22	28,5
5	Utbedring kryssingspunkt gående.		5	5	3,5	4	17,5
6	Sideterreng rekkveksnormalen ≥60km/t.		3	3	3	15	24
7	Fv. 428 Sandvikveien, Stavanger kommune. Undergang.		22				22
8	Fv. 404 Rogalandsgata x fv. 421. Stavanger kommune. Utbedring.		1				1
9	Påskehusvegen, Sola kommune. Fortau og utbedring	0,1	1				1,1
10	Fv. 510 x fv. 443 Forusbeen. Sola. Utbedring undergang.		0,5	3			3,5
11	Postveien Sandnes kommune, fortau		0,5	2,5			3
12	Fv. 411 Løkkeveien Stavanger kommune, miljøgate		0,5	16,5			17
13	Skadbergbakken Sola kommune, fortau		0,5				0,5
14	Møllegata Stavanger kommune, miljøgate	0,5	2				2,5
15	Hellevegen Sola kommune, fortau		0,5				0,5
16	Tilfartskontroll og variabel fartsgrense E39	5	30	25			60
17	Strakstiltak etter dødsulykke/alvorlig ulykke		1	1	1	11	14
18	Fv. 334 Austråttbakken Sandnes, venstresvingefelt			0,2	7,8		8
alle		7	73	60,2	19,3	56	216

Mulig utbyggingsperiode:

2017–2020
